

# КРТ Нагатино

Комплексная территория 14,62 га в Нагатино-Садовниках, квартал 77:05:0004001. Разбор для решения об участии в торгах и полный расчёт финансовой модели.

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Дата расчёта<br>23.08.2026            | Движок<br>DevelopAid 0.19.59 |
| Идентификатор расчёта<br>99e349b27c6e | Объём<br>26 страниц          |

## Часть I · Разбор для решения — стр. 2

1. **Вердикт** — сколько проект даёт и какой ценой
2. **Предмет торгов** — что город даёт и что требует взамен
3. **Граница ответственности** — что от города, а что придумали мы
4. **Ключевая экономика**, очереди, отдельно стоящие объекты, выручка, CAPEX, финансирование
5. **Чувствительность** — что возвращает проект в прибыль
6. **Инфляция** — цена и себестоимость растут вместе
7. **Риски** по убыванию цены вопроса и три шага до заявки
8. **Границы расчёта** — чего в нём нет

## Часть II · Расчёт движка — стр. 13

1. ТЭП по продуктам и ключевая экономика
2. Удельная экономика в двух базах
3. Оценка целесообразности покупки
4. Структура расходов, выручка по продуктам
5. Очереди: параметры, сравнение, удельные показатели
6. Стратегия финансирования и календарь проекта
7. Чувствительность и предпосылки расчёта

**Обе части — из одного прогона.** Разбор не пересказывает расчёт и не считает параллельно: числа взяты из одного вызова модели с идентификатором 99e349b27c6e. Если они где-то разойдутся — верить нельзя ни одной части.

**Это разбор экономики для решения об участии в торгах,** а не оценка рыночной стоимости и не рекомендация. Цены реализации и себестоимость — предпосылки, не сметы и не выдача рынка; что именно принято нами, а не задано городом, перечислено отдельной таблицей в части I.

## Идти ли на КРТ Нагатино

Площадка 14,62 га в Нагатино-Садовниках. Цена права 2,40 млрд  $\text{₽}$ , обязательства — школа на 1 000 мест, садик на 350 и снос 39 строений. Считано движком DevelopAid на сегодняшней цене жилья 600 тыс  $\text{₽}/\text{м}^2$  и себестоимости отдельно стоящих объектов 240 тыс  $\text{₽}/\text{м}^2$ . Продукт, очерёдность и цены город не задаёт — эти решения наши и вынесены отдельной таблицей.

Квартал 77:05:0004001    Статус подготовка к торгам    Расчёт 23.08.2026    Движок DevelopAid 0.19.56

### Проект в плюсе на 2,24 млрд $\text{₽}$ — это 1,1% маржи, то есть запаса нет

Себестоимость офисов и торгового центра принята 240 тыс  $\text{₽}/\text{м}^2$  — базовая предпосылка 200 плюс 20% на риск сметы. Цена жилья — сегодняшние 600 тыс  $\text{₽}/\text{м}^2$ . На этих числах проект даёт **+2,24 млрд  $\text{₽}$  чистой прибыли при выручке 211,17**. Это не убыток, но и не запас: одна десятая процента в любую сторону — и знак меняется.

**Наземная площадь проекта — 415 180  $\text{м}^2$**  (жилая застройка 229 490, нежилое ОДО 185 690), плюс соцобъекты 28 520  $\text{м}^2$ , которые строятся и передаются городу. Подземная часть 87 605  $\text{м}^2$  в наземную не входит. Продаваемая площадь — 257 340  $\text{м}^2$ . «ГНС», «продаваемая площадь» и «коэффициент выхода» — термины финансовой модели DevelopAid, а не градостроительной методики Москвы: город считает от суммарной поэтажной площади.

|                                                                        |                                                   |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Выручка<br><b>211,17</b><br>млрд $\text{₽}$                            | Расходы всего<br><b>208,94</b><br>млрд $\text{₽}$ | Чистая прибыль<br><b>2,24</b><br>млрд $\text{₽}$ · маржа 1,1%         |
| Порог по цене<br><b>587</b><br>тыс $\text{₽}/\text{м}^2$ · сегодня 600 | LLCR<br><b>1,01x</b><br>идеал банка 1,20x         | Долг ПФ на конец<br><b>0,0</b><br>млрд $\text{₽}$ · гасится полностью |

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ

Что город даёт и что требует взамен

| Условия КРТ по извещению о торгах |                      |                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| УСЛОВИЕ                           | ЗНАЧЕНИЕ             | ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ                                      |
| Площадка                          | 14,62 га             | квартал 77:05:0004001, Нагатино-Садовники, вне ТТК                |
| Цена права                        | 2 403,7 млн ₽        | 1,5% расходов проекта — не тот рычаг                              |
| Наземная площадь                  | 443 700 м²           | жилая застройка 229 490 · нежилое ОДО 185 690 · соцобъекты 28 520 |
| · в том числе нежилое             | 185 690 м²           | город даёт объём, состав не задан — разбивка на офис и ТЦ наша    |
| Подземная часть                   | 87 605 м²            | 2 503 места; в наземную площадь не входит, считается отдельно     |
| Продаваемая площадь               | 257 340 м²           | квартиры 140,2 тыс м², 2 389 лотов по 58,7 м²                     |
| Школа 1 000 мест                  | 22 220 м²            | построить и передать безвозмездно · 6,30 млрд ₽                   |
| Детский сад 350 мест              | 6 300 м²             | построить и передать безвозмездно · 1,89 млрд ₽                   |
| Снос застройки                    | 54 871,9 м² · 39 ОКС | 768 млн ₽ по оценке 14 тыс ₽/м² — сметы нет                       |
| Расселение                        | нет                  | в перечне гаражи и админздания, жилых домов нет                   |
| Плата за смену ВРИ                | 0 ₽                  | вид использования меняется решением о КРТ                         |
| Срок КРТ                          | 9 лет                | график укладывается в 8,0 лет — запас год                         |

**Чего в извещении нет, а деньги за этим стоят.** Сети и дороги вне площадки, компенсации арендаторам действующей промзоны за досрочное расторжение, доля объектов под реконструкцию вместо сноса (признак «Снос/реконструкция» стоит у всех 39, площадь взята верхней границей), ППТ с ТЭП по объектам. Любое из этого — обязательство неизвестной величины поверх посчитанного, а запаса прочности у проекта сейчас нет вовсе.

ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Что здесь от города, а что придумали мы

Выше — условия торгов. Ниже — решения, которых в извещении нет: их принял DevelopAid, и на них стоит вся экономика этого отчёта. Другой участник примет другие, и получит другие числа на той же площадке.

| РЕШЕНИЕ                                                                                             | ЧЬЁ                    | ЧЕМ ОНО СТОИТ                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Состав нежилого:</b> 185 690 м² разделены поровну — офисный центр 92 845 и торговый центр 92 845 | наше                   | Город даёт объём нежилого, а не его состав. Пропорция, продукт и цены — предположение. Офис и ТЦ дают разную выручку с метра (717 против 775 тыс ₽) и разный календарь продаж.              |
| <b>Четыре очереди с шагом 12 месяцев</b>                                                            | наше                   | ППТ с очередностью не раскрыт. Число очередей задаёт и график выборки долга, и инфляцию затрат: каждый год сдвига — это 8% к себестоимости и 8% к стартовой цене.                           |
| <b>Офисы в третьей очереди, торговый центр в четвёртой</b>                                          | наше                   | Деловая часть вводится, когда квартал заселён. Сдвиг ТЦ на одну очередь раньше — минус около 1 млрд ₽ вала по объекту: он теряет два года роста цены, но и два года роста себестоимости.    |
| <b>Садик в первой очереди, школа во второй</b>                                                      | экспертное предложение | Срок ввода соцобъектов в извещении не раскрыт. Ставим их к заселению — первые корпуса вводятся в 2032 году. По деньгам это почти безразлично (0,29 млрд ₽), по обязательству — существенно. |
| <b>Жильё разделено по очередям поровну</b> — по 53 930 м² наземной площади                          | наше                   | Документа о разбивке нет. Неравные очереди меняют профиль долга и LLCR каждой из них.                                                                                                       |
| <b>Цена жилья 600 тыс ₽/м², себестоимость СМР 175, офисы и ТЦ 240</b>                               | предпосылки            | Не сметы и не выдача рынка. Разброс по ним — 46 млрд ₽ чистой прибыли, см. раздел чувствительности.                                                                                         |
| <b>Ставка сноса 14 тыс ₽/м²</b>                                                                     | оценка                 | Источника по сносу нет; принята верхняя граница диапазона 10–14. Цена вопроса — 220 млн ₽.                                                                                                  |
| <b>Квартирография:</b> средний лот 58,7 м², 2 389 квартир, население 4 250                          | расчёт                 | Выведено из площади квартир по 33 м² на жителя (приложение 5 к 945-ПП), а не из ППТ.                                                                                                        |

**Это не оговорка мелким шрифтом, а половина ответа.** Город задал объёмы и обязательства; продукт, очередность и цены задали мы. При марже 1,1% любое из этих решений меняет знак результата — поэтому они и вынесены отдельной таблицей, а не растворены в предпосылках расчёта.

СТАНДАРТНЫЙ ОТЧЁТ ДВИЖКА

Ключевая экономика

| База строительного объёма — 502 785 м² (наземная площадь 415 180 без соцобъектов + подземная часть 87 605); база продаваемой — 257 340 м². «Строительный объём» — база финансовой модели DevelopAid, не градостроительный показатель |                |                                |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| ПОКАЗАТЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                           | ВСЕГО          | ТЫС. ₽/М² СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЁМА | ТЫС. ₽/М² ПРОДАВАЕМОЙ |  |
| Выручка                                                                                                                                                                                                                              | 211,17 млрд. ₽ | 420,0                          | 820,6                 |  |
| CAPEX                                                                                                                                                                                                                                | 164,30 млрд. ₽ | 326,8                          | 638,4                 |  |
| Маркетинг и продажи                                                                                                                                                                                                                  | 14,78 млрд. ₽  | 29,4                           | 57,4                  |  |
| EBITDA                                                                                                                                                                                                                               | 32,10 млрд. ₽  | 63,8                           | 124,7                 |  |
| Стоимость финансирования                                                                                                                                                                                                             | 22,96 млрд. ₽  | 45,7                           | 89,2                  |  |
| Прибыль до налога                                                                                                                                                                                                                    | 9,14 млрд. ₽   | 18,2                           | 35,5                  |  |
| Налог на прибыль                                                                                                                                                                                                                     | 3,77 млрд. ₽   | 7,5                            | 14,6                  |  |
| НДС                                                                                                                                                                                                                                  | 3,14 млрд. ₽   | 6,2                            | 12,2                  |  |
| Чистая прибыль                                                                                                                                                                                                                       | 2,24 млрд. ₽   | 4,5                            | 8,7                   |  |
| Маржинальность                                                                                                                                                                                                                       | 1,1%           | —                              | —                     |  |
| NPV собственного капитала                                                                                                                                                                                                            | -3,91 млрд. ₽  | —                              | —                     |  |
| LLCR проекта                                                                                                                                                                                                                         | 1,01x          | —                              | —                     |  |

Сравнение очередей

| Старт 01.2027, ИРД 36 мес., строительство 24 мес., шаг очередей 12 мес. |                        |                 |         |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|---------|--------|-------|
| ОЧЕРЕДЬ                                                                 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ, М² | ПРОДАВАЕМАЯ, М² | ВЫРУЧКА | РАСХОДЫ | ЧИСТАЯ | LLCR  |
| Очередь 1 ДОО                                                           | 73 612                 | 38 153          | 28,88   | 32,62   | -3,74  | 0,89x |
| Очередь 2 СОШ                                                           | 73 612                 | 38 153          | 31,19   | 36,51   | -5,32  | 0,85x |
| Очередь 3<br>офисы 92 845 м²                                            | 178 078                | 90 517          | 72,68   | 67,39   | +5,29  | 1,08x |
| Очередь 4<br>ТЦ 92 845 м²                                               | 177 482                | 90 517          | 78,42   | 72,41   | +6,00  | 1,09x |
| Проект                                                                  | 502 785                | 257 340         | 211,17  | 208,94  | +2,24  | 1,01x |

**Проект делится надвое: жилые очереди в минусе, деловые в плюсе.** Первые две несут всё жильё первых лет плюс садик и школу — вместе −9,06 млрд ₽ при LLCR 0,85–0,89х. Третья и четвёртая, куда встают офисы и торговый центр, дают +11,29 при 1,08–1,09х. Проект держится на деловой части, а не на жилые.

**Так и должно читаться.** Соцобъекты строятся раньше, чем окупаются метры, которые они обслуживают, а офисы и ТЦ вводятся на пятый–седьмой год, когда цена успела вырасти на 30–40%. Опасность в другом: две первые очереди с LLCR ниже 0,9х банк будет финансировать неохотно, и разговаривать с ним придётся про проект целиком, а не про очередь.

Отдельно стоящие объекты

|                                                            |           |                  |             |            |            |         |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Офисы и ТЦ при себестоимости 240 тыс ₺/м² наземной площади |           |                  |             |            |            |         |
| ОБЪЕКТ                                                     |           | НАЗЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ | ПРОДАВАЕМАЯ | ВЫРУЧКА    | CAPEX      | ВАЛ     |
| Офисы / МФОЦ                                               | очередь 3 | 92 845 м²        | 52 365 м²   | 37 559 млн | 25 991 млн | +11 569 |
| Торговый центр / ОСЗ                                       | очередь 4 | 92 845 м²        | 52 365 м²   | 40 564 млн | 28 070 млн | +12 494 |

**Оба объекта прибыльны даже после подорожания, и ТЦ прибыльнее офисов.** Вал по офисам 11,6 млрд, по ТЦ 12,5 — вместе 24,1 млрд ₽ до общих расходов, финансирования и налога. ТЦ выигрывает не качеством, а календарём: он в четвёртой очереди, на год позже офисов, и его цена успевает вырасти сильнее себестоимости.

**Именно они держат проект.** Убрать их нельзя — без деловой части нечем крыть социальную нагрузку. И именно поэтому подорожание этих 185,7 тыс м² наземной площади на 20% стоило 11,0 млрд ₽ чистой прибыли: 13,22 при себестоимости 200 против 2,24 при 240.

Выручка по продуктам

|                    |            |                |                       |                |
|--------------------|------------|----------------|-----------------------|----------------|
| ПРОДУКТ            | ОБЪЁМ      | СТАРТОВАЯ ЦЕНА | СРЕДНЯЯ РЕАЛИЗОВАННАЯ | ВЫРУЧКА, МЛН ₽ |
| Квартиры           | 140 218 м² | 600 тыс ₽/м²   | 837 тыс ₽/м²          | 117 309,7      |
| Коммерция ОСЗ (ТЦ) | 52 365 м²  | 500 тыс ₽/м²   | 775 тыс ₽/м²          | 40 563,9       |
| Офисы / МФОЦ       | 52 365 м²  | 500 тыс ₽/м²   | 717 тыс ₽/м²          | 37 559,2       |
| Подземный паркинг  | 2 341 мест | 3 000 тыс ₽    | 3 402 тыс ₽           | 7 964,6        |
| Коммерция 1 этажа  | 12 392 м²  | 450 тыс ₽/м²   | 627 тыс ₽/м²          | 7 775,8        |
| Итого              | 257 340 м² | —              | —                     | 211 173,2      |

CAPEX по статьям

| Всего 164 296 млн ₽ · себестоимость офисов и ТЦ 240 тыс ₽/м² |                  |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| СТАТЬЯ                                                       | МЛН. ₽           | ДОЛЯ          |
| Основное строительство — наземная часть                      | 45 242,2         | 27,5%         |
| ТЦ / коммерция ОСЗ                                           | 28 069,9         | 17,1%         |
| Офисы / МФОЦ                                                 | 25 990,7         | 15,8%         |
| Основное строительство — подземная часть                     | 11 068,3         | 6,7%          |
| Социальная нагрузка                                          | 9 460,7          | 5,8%          |
| Вознаграждение генподрядчика                                 | 8 388,2          | 5,1%          |
| Резерв                                                       | 7 709,1          | 4,7%          |
| Технический заказчик / стройконтроль                         | 5 991,6          | 3,6%          |
| Благоустройство                                              | 4 130,2          | 2,5%          |
| Управление проектом                                          | 3 615,4          | 2,2%          |
| Наружные инженерные сети                                     | 3 605,6          | 2,2%          |
| Проектирование, стадия РД                                    | 2 990,0          | 1,8%          |
| Приобретение / цена входа                                    | 2 403,7          | 1,5%          |
| Проектирование, стадия П                                     | 2 110,6          | 1,3%          |
| Содержание стройплощадки                                     | 1 688,0          | 1,0%          |
| Подготовительные работы                                      | 967,4            | 0,6%          |
| ИРД · Сдача и ввод · Авторский надзор                        | 863,9            | 0,5%          |
| <b>Итого CAPEX</b>                                           | <b>164 295,5</b> | <b>100,0%</b> |

### Финансирование

| ПОКАЗАТЕЛЬ                           | ЗНАЧЕНИЕ            | КОММЕНТАРИЙ                                             |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Расчётный лимит БРИДЖ                | 8,27 млрд. ₽        | покупка + проектирование + денежная соцнагрузка         |
| Фактический пик БРИДЖ                | 30,19 млрд. ₽       | втрое выше банковского лимита — разрыв закрывать своими |
| Лимит ПФ                             | 179,09 млрд. ₽      | выведен из потребности                                  |
| Пик ПФ                               | 105,02 млрд. ₽      | он же пиковый общий долг                                |
| Пиковый эскроу                       | 120,50 млрд. ₽      | покрытие 1,15× пикового долга                           |
| Проценты БРИДЖ                       | 9,27 млрд. ₽        | ставка ключевая + спред 6 п.п.                          |
| Проценты ПФ                          | 9,95 млрд. ₽        | средняя 3,89% — ступени по покрытию эскроу работают     |
| Плата за лимит и резервирование      | 0,94 млрд. ₽        | 0,7% и 0,1% от лимита ПФ                                |
| Стоимость финансирования всего       | 22,96 млрд. ₽       | 10,9% выручки · 18,64 при себестоимости ОСЗ 200         |
| <b>Непогашенный долг ПФ на конец</b> | <b>0,00 млрд. ₽</b> | <b>ПФ гасится полностью</b>                             |

**Финансирование — вторая половина проблемы.** Подорожание офисов и ТЦ на 10,3 млрд ₽ утянуло стоимость финансирования с 18,64 до 22,96 — ещё 4,32 млрд ₽ сверх самой стройки. Занимать приходится больше и дольше, а горизонт восемь лет. Отсюда правило для этого проекта: **рубль себестоимости стоит дороже рубля.**

**ПФ гасится полностью** — проект не заканчивается с долгом перед банком. Ступени ставки по покрытию эскроу при этом работают в полную силу: средняя ставка ПФ выходит 3,89% против базовых 13,5%, потому что эскроу покрывает долг с запасом (120,5 против 105,0 в пике).

**Флаг, который никуда не делся:** фактический пик БРИДЖа 30,2 млрд против расчётного лимита 8,3. Разрыв в 21,9 млрд банк по БРИДЖу не даёт — его надо закрывать собственными деньгами до открытия ПФ. Это главное требование к капиталу входящего, и оно не про доходность, а про то, кто вообще может участвовать.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Что возвращает проект в прибыль

| Себестоимость офисов и ТЦ · жильё 600, СМР жилья 175 |                |                |       |       |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|
|                                                      | ОСЗ, тыс. ₽/м² | Чистая прибыль | Маржа | LLCR  |
| 200 — прежняя предпосылка                            |                | 13,22 млрд     | 6,3%  | 1,07x |
| 220                                                  |                | 7,40 млрд      | 3,5%  | 1,04x |
| 240 — базовый сценарий                               |                | 2,24 млрд      | 1,1%  | 1,01x |
| 260                                                  |                | -4,33 млрд     | -2,1% | 0,98x |

| Цена жилья · при себестоимости ОСЗ 240 |                 |                |       |       |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|-------|-------|
|                                        | Цена, тыс. ₽/м² | Чистая прибыль | Маржа | LLCR  |
| 570                                    |                 | -2,75 млрд     | -1,3% | 0,99x |
| 587 — порог безубыточности             |                 | 0,00 млрд      | 0,0%  | 1,00x |
| 600 — сегодняшняя                      |                 | 2,24 млрд      | 1,1%  | 1,01x |
| 650                                    |                 | 10,31 млрд     | 4,7%  | 1,05x |
| 700                                    |                 | 18,69 млрд     | 8,1%  | 1,09x |
| 750                                    |                 | 26,98 млрд     | 11,2% | 1,14x |
| 800                                    |                 | 34,15 млрд     | 13,6% | 1,17x |



| Себестоимость жилья · при себестоимости ОСЗ 240 и цене 600 |                        |                |       |       |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------|-------|
|                                                            | СМР ЖИЛЬЯ, ТЫС. ₺/м²   | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | МАРЖА | LLCR  |
|                                                            | 175 — наша предпосылка | 2,24 млрд      | 1,1%  | 1,01x |
|                                                            | 155                    | 8,18 млрд      | 3,9%  | 1,04x |
|                                                            | 135                    | 14,82 млрд     | 7,0%  | 1,08x |
|                                                            | 125                    | 18,50 млрд     | 8,8%  | 1,10x |

**Порог безубыточности — цена жилья 587 тыс ₺/м².** Сегодняшние 600 дают запас в 13 тыс ₺/м², то есть 2,2% цены. Каждые 50 тыс ₺/м² цены дают около 8 млрд ₺ прибыли, каждые 20 тыс ₺/м² себестоимости жилья — около 6 млрд, каждые 20 тыс ₺/м² себестоимости офисов и ТЦ — около 5,7 млрд.

**Цена входа — не рычаг.** Если бы город отдал право бесплатно, чистая прибыль выросла бы с 2,24 до 6,86 млрд ₺ (маржа 3,3%, LLCR 1,03x). Торговаться на аукционе за эти 2,4 млрд имеет смысл, но проект решается не здесь.

**Шаг очередей тоже не работает:** уплотнение с 12 месяцев до 9 и до 6 оставляет результат неизменным. График здесь не рычаг.

#### ИНФЛЯЦИЯ

### Цена и себестоимость растут вместе — и это спасает

Стартовые 600 тыс ₺/м² — цена первого месяца продаж первой очереди. Модель разгоняет её сама: индексация стартовой цены каждой следующей очереди 8% в год плюс рост 1,5% в месяц в ходе продаж. **Средняя реализованная цена квартир выходит 837 тыс ₺/м²** — на 39% выше стартовой. Себестоимость индексируется тем же порядком.

| Сдвиг базы цен на два года вперёд — цена и себестоимость вместе, в базовом сценарии (ОСЗ 240) |            |                |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|-------|
| ИНФЛЯЦИЯ                                                                                      | ЦЕНА / СМР | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | МАРЖА | LLCR  |
| как есть                                                                                      | 600 / 175  | 2,24 млрд      | 1,1%  | 1,01x |
| 6% в год                                                                                      | 674 / 197  | 7,68 млрд      | 3,4%  | 1,04x |
| 8% в год                                                                                      | 700 / 204  | 9,79 млрд      | 4,2%  | 1,05x |
| 10% в год                                                                                     | 726 / 212  | 11,60 млрд     | 4,9%  | 1,05x |

| А если себестоимость обгонит цену — цена стоит на 600, растёт только стройка |     |                |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------|-------|
| ИНФЛЯЦИЯ СТРОЙКИ                                                             | СМР | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | МАРЖА | LLCR  |
| 6% в год                                                                     | 197 | -5,00 млрд     | -2,4% | 0,98x |
| 8% в год                                                                     | 204 | -8,07 млрд     | -3,8% | 0,96x |
| 10% в год                                                                    | 212 | -10,81 млрд    | -5,1% | 0,95x |

**Вот настоящий риск проекта.** Пока цена и себестоимость растут вместе, инфляция даже помогает: прибыль поднимается с 2,24 до 11,60 млрд ₽. Стоит стройке обогнать цену на те же два года — и проект уходит в убыток от 5,0 до 10,8 млрд ₽. Разброс между этими двумя ветками — 22,4 млрд ₽ на одной и той же площадке.

Проверить это по проекту нечем: обе ставки — предпосылки. Смета покажет сегодняшнюю себестоимость, но не её траекторию на восемь лет.

РИСКИ

По убыванию цены вопроса

| РИСК                                            | ЦЕНА                       | ЧЕМ ЗАКРЫВАЕТСЯ                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Цена реализации жилья — 600 против 800 тыс ₽/м² | 31,9 млрд ₽                | модуль рынка по Нагатино-Садовникам            |
| Себестоимость офисов и ТЦ — 200 против 260      | 17,6 млрд ₽                | смета на отдельно стоящие объекты              |
| Себестоимость жилья — 175 против 125 тыс ₽/м²   | 16,3 млрд ₽                | смета подрядчика по проекту-аналогу            |
| Разрыв по БРИДЖу — 30,2 против лимита 8,3       | 21,9 млрд ₽<br>собственных | структура финансирования до открытия ПФ        |
| Нераскрытые обязательства КРТ                   | неизвестна                 | запрос организатору торгов до подачи заявки    |
| Снос — диапазон оценки 10–14 тыс ₽/м²           | 220 млн ₽                  | смета на демонтаж                              |
| Срок ИРД — 36 месяцев предпосылкой              | срок КРТ                   | 48 месяцев выводят проект за девятилетний срок |

ЧТО ДАЛЬШЕ

Три шага до заявки

- **Ориентир цены по району.** Порог безубыточности — 587 тыс ₽/м², сегодняшняя цена 600. Запас 2,2%, и первое, что надо знать, — где на самом деле рынок Нагатино-Садовников и куда он идёт. Двести тысяч разницы в цене — это 32 млрд ₽ прибыли.
- **Смета — на всё, включая офисы и ТЦ.** Двадцать процентов по двум объектам стоили проекту 11,0 млрд ₽ прибыли и увеличи маржу с 6,3% до 1,1%. Считать отдельно стоящие объекты по круглым 200 или 240 тыс ₽/м² больше нельзя: это 185,7 тыс м² наземной площади, 45% всей наземной застройки.
- **Запрос организатору торгов.** Сети и дороги вне площадки, компенсации арендаторам промзоны, доля объектов под реконструкцию. При нулевой марже любое нераскрытое обязательство — это прямой убыток.

**Если ответы придут хорошими** — смета жилья около 125, ОСЗ около 200, цена 750 — проект даёт **48,83 млрд ₽ чистой прибыли, маржу 20,3% и LLCR 1,29х**. Это выше банковского идеала 1,20х. Разброс между базовым сценарием и таким — 46,6 млрд ₽, и он весь держится на числах, которые пока никем не подтверждены. Именно это и есть предложение риск-тейкеру: не «проект хороший», а «проект с ценой вопроса в 46 миллиардов, и её можно снять сметой и выдачей рынка до подачи заявки».

ОГОВОРКА

## Границы этого расчёта

- Цены реализации, себестоимость СМР и стоимость места соцобъекта — **предпосылки**, не сметы и не выдача рынка. Себестоимость офисов и ТЦ 240 тыс ₽/м² — базовая предпосылка 200 плюс 20% на риск сметы.
- Ставка сноса 14 тыс ₽/м² — **оценка DevelopAid** в диапазоне 10–14; источника по сносу нет ни одного, применена верхняя граница.
- Население 4 250 человек выведено из площади квартир, не из ППТ. Разбивка жилья по очередям и размещение школы и садика — допущения.
- **Себестоимость отдельно стоящих объектов индексируется по номеру очереди, а не по дате начала строительства.** Внутри очереди объект стоимость не переиндексирует — офисы и ТЦ выходят на несколько процентов оптимистичнее, чем есть.
- **Решения, которых нет в извещении, перечислены отдельно** — раздел «Что здесь от города, а что придумали мы». Состав нежилого, число очередей, размещение объектов и цены задал DevelopAid, а не город.
- **Показатели площади — из разных источников, и это не одно и то же.** Город считает нагрузки от суммарной поэтажной площади (методика ГлавАПУ). «Общая площадь здания» — термин проектной документации. «Продаваемая площадь», «коэффициент выхода» и «ГНС» — показатели финансовой модели DevelopAid, нормативными терминами они не являются. Удельные в таблице ключевой экономики считаются на строительный объём (наземная 415 180 + подземная 87 605) — база названа в подписи таблицы.
- **Размещение школы и садика по очередям — допущение DevelopAid.** Срок ввода соцобъектов в извещении о торгах не раскрыт. Мы ставим ДОО не позже первой очереди, СОШ не позже второй — по смыслу заселения. Если условия КРТ потребуют раньше, экономика ухудшится; если разрешат позже, проект выигрывает 0,29 млрд ₽ — то есть по деньгам это почти безразлично, и решать надо по обязательству.
- Срок КРТ модель не проверяет: 8,0 лет посчитаны отдельно по календарю очередей.
- Норматив приобъектной парковки для отдельно стоящих офиса и ТЦ с выгрузкой ГлавАПУ не сверен.

---

Расчёт: DevelopAid 0.19.56 · 23.08.2026. Источники: извещение о торгах, проектный файл площадки КРТ\_Нагатино .json, рабочая финансовая модель.

Это разбор экономики для решения об участии в торгах, а не оценка рыночной стоимости и не рекомендация. Числа, помеченные предпосылкой, документами не подтверждены.

# Расчёт движка DevelopAid

---

Часть I выше — разбор для решения: на чём посчитано, что задал город, что приняли мы, чем проект живёт и от чего умирает.

Часть II ниже печатает сам движок по тем же вводным. Это не пересказ и не вторая версия расчёта: обе части взяты из одного прогона, идентификатор расчёта указан на её первой странице. Числа в них обязаны совпадать — если разошлись, верить нельзя ни одной.

- ТЭП по продуктам и ключевая экономика
- Удельная экономика в двух базах
- Оценка целесообразности покупки
- Структура расходов и выручка по продуктам
- Очереди: параметры, сравнение, удельные показатели
- Стратегия финансирования и календарь проекта
- Чувствительность и предпосылки расчёта

# DevelopAid

## Инвестиционный отчёт по девелоперскому проекту КРТ Нагатино (77:05:0004001)

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Дата расчёта          | 23.08.2026                        |
| Источник ТЭП          | ТЭП DevelopAid                    |
| Класс жилья           | Комфорт                           |
| Сценарий              | Базовый                           |
| Идентификатор расчёта | 99e349b27c6e · DevelopAid 0.19.59 |

### ТЭП

| Продукт           | Строит. объём, м² | Продаваемая, м² | Кол-во |
|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Квартиры          | 215 721           | 140 218         | 2 389  |
| Коммерция 1 эт.   | 13 769            | 12 392          | 0      |
| Коммерция ОСЗ     | 92 845            | 52 365          | 0      |
| Офисы             | 92 845            | 52 365          | 0      |
| Подземный паркинг | 87 605            | 0               | 2 503  |
| ДОУ               | 0                 | 0               | 350    |
| СОШ               | 0                 | 0               | 1 000  |
| Итого             | 502 785           | 257 340         | 6 242  |

### Ключевая экономика

| Показатель                                   | Значение      |
|----------------------------------------------|---------------|
| Цена приобретения                            | 2,40 млрд ₽   |
| Смена ВРИ / земельные права                  | 0,0 млн ₽     |
| Выручка                                      | 211,17 млрд ₽ |
| Расходы всего                                | 208,94 млрд ₽ |
| EBITDA                                       | 32,10 млрд ₽  |
| Чистая прибыль                               | 2,24 млрд ₽   |
| Маржинальность                               | 1,1%          |
| LLCR                                         | 1,01x         |
| Расчётный БРИДЖ                              | 8,27 млрд ₽   |
| Фактический пик БРИДЖ                        | 30,19 млрд ₽  |
| Пиковая (непокрытая эскроу) задолженность ПФ | 6,80 млрд ₽   |
| Проценты и комиссии                          | 22,96 млрд ₽  |
| Остаток ПФ после раскрытия эскроу в РВЭ      | 6,71 млрд ₽   |

## Удельная экономика проекта

| Показатель          | Всего         | тыс ₹/м²<br>строительного<br>объёма | тыс ₹/м²<br>продаваемой |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Выручка             | 211,17 млрд ₹ | 420,0                               | 820,6                   |
| CAPEX               | 164,30 млрд ₹ | 326,8                               | 638,4                   |
| Маркетинг и продажи | 14,78 млрд ₹  | 29,4                                | 57,4                    |
| EBITDA              | 32,10 млрд ₹  | 63,8                                | 124,7                   |
| Проценты и комиссии | 22,96 млрд ₹  | 45,7                                | 89,2                    |
| Налог на прибыль    | 3,77 млрд ₹   | 7,5                                 | 14,6                    |
| НДС                 | 3,14 млрд ₹   | 6,2                                 | 12,2                    |
| Полные расходы      | 208,94 млрд ₹ | 415,6                               | 811,9                   |
| Чистая прибыль      | 2,24 млрд ₹   | 4,4                                 | 8,7                     |

База — строительный объём 502 785 м²: наземная часть 415 180 м² плюс подземная 87 605 м². База продаваемой — 257 340 м² монетизируемой площади (паркинг и кладовые продаются штуками и в неё не входят). Показатели на метр — термины финансовой модели DevelopAid, а не градостроительной методики: город считает нагрузки от суммарной поэтажной площади.

## Оценка целесообразности покупки

|           |                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вывод     | Требует пересмотра условий покупки                                                                                                               |
| Основание | Проект формирует прибыль, однако LLCR ниже целевого уровня 1,20х. Следует проверить цену покупки, себестоимость, сроки и условия финансирования. |

## Очереди проекта

| Очередь              | Сдвиг старта, мес. | Строительство, мес. | Инфляция затрат | Индексация цены |
|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Очередь 1            | 0                  | 24                  | 0,0%            | 0,0%            |
| Очередь 2            | 12                 | 24                  | 8,0%            | 8,0%            |
| Очередь 3 ·<br>офисы | 24                 | 24                  | 16,6%           | 16,6%           |
| Очередь 4 · ТЦ       | 36                 | 24                  | 26,0%           | 26,0%           |

## Сравнение очередей

| Очередь              | Строит. объём,<br>м² | Продаваемая, м² | Выручка          | Расходы          | Чистая прибыль | LLCR  |
|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------|
| Очередь 1            | 73 612               | 38 153          | 28,88 млрд ₽     | 32,62 млрд ₽     | -3,74 млрд ₽   | 0,89х |
| Очередь 2            | 73 612               | 38 153          | 31,19 млрд ₽     | 36,51 млрд ₽     | -5,32 млрд ₽   | 0,85х |
| Очередь 3 ·<br>офисы | 178 078              | 90 517          | 72,68 млрд ₽     | 67,39 млрд ₽     | 5,29 млрд ₽    | 1,08х |
| Очередь 4 ·<br>ТЦ    | 177 482              | 90 517          | 78,42 млрд ₽     | 72,41 млрд ₽     | 6,00 млрд ₽    | 1,09х |
| Итого                | 502 785              | 257 340         | 211,17 млрд<br>₽ | 208,94 млрд<br>₽ | 2,24 млрд ₽    | 1,01х |

## Стратегия финансирования очередей

| Очередь              | Затраты до РНС | Cash проекта | Свои средства | Новый БРИДЖ  | ПФ после РНС |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Очередь 1            | 7,01 млрд ₽    | 0,0 млн ₽    | 0,0 млн ₽     | 7,01 млрд ₽  | 26,36 млрд ₽ |
| Очередь 2            | 8,51 млрд ₽    | 0,0 млн ₽    | 0,0 млн ₽     | 8,51 млрд ₽  | 29,84 млрд ₽ |
| Очередь 3 ·<br>офисы | 22,60 млрд ₽   | 0,0 млн ₽    | 0,0 млн ₽     | 22,60 млрд ₽ | 58,48 млрд ₽ |
| Очередь 4 ·<br>ТЦ    | 24,26 млрд ₽   | 0,0 млн ₽    | 0,0 млн ₽     | 24,26 млрд ₽ | 62,78 млрд ₽ |
| Итого                | 62,38 млрд ₽   | 0,0 млн ₽    | 0,0 млн ₽     | 62,38 млрд ₽ | —            |

Независимое финансирование очередей включено. Свободный cash учитывается только после обслуживания долга более ранней очереди; эскроу, будущая прибыль и банковские лимиты не используются.

Прибыль очередей выше — кассовая, как в CF-листах Excel-книги: общие расходы (покупка, ВПИ, соцнагрузка) стоят в очереди их оплаты. Аллоцированная прибыль разносит их экономически: Очередь 1: -2,51 млрд ₽; Очередь 2: -5,79 млрд ₽; Очередь 3 · офисы: 4,90 млрд ₽; Очередь 4 · ТЦ: 5,64 млрд ₽. Сумма по проекту в обеих раскладках одна.

## Удельные показатели по очередям

| Очередь              | Выручка на<br>м² прод. | в т.ч.<br>квартиры | Выручка на<br>м² строит.<br>объёма | Расходы на<br>м² прод. | Расходы на<br>м² строит.<br>объёма | Прибыль на<br>м² прод. | Прибыль на<br>м² строит.<br>объёма |
|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Очередь 1            | 757,0                  | 742,7              | 392,3                              | 855,0                  | 443,1                              | -98,0                  | -50,8                              |
| Очередь 2            | 817,5                  | 802,1              | 423,7                              | 957,0                  | 496,0                              | -139,4                 | -72,3                              |
| Очередь 3 ·<br>офисы | 803,0                  | 866,2              | 408,2                              | 744,5                  | 378,4                              | 58,5                   | 29,7                               |

| Очередь           | Выручка на<br>м² прод. | в т.ч.<br>квартиры | Выручка на<br>м² строит.<br>объёма | Расходы на<br>м² прод. | Расходы на<br>м² строит.<br>объёма | Прибыль на<br>м² прод. | Прибыль на<br>м² строит.<br>объёма |
|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Очередь<br>4 · ТЦ | 866,3                  | 935,5              | 441,8                              | 800,0                  | 408,0                              | 66,3                   | 33,8                               |
| Итого             | 820,6                  | 836,6              | 420,0                              | 811,9                  | 415,6                              | 8,7                    | 4,4                                |

Значения удельных показателей — в тыс. Р за м². «Выручка на м² прод.» включает штучные продукты (паркинг, кладовые); «в т.ч. квартиры» — только квартиры на м² их продаваемой площади, эта же строка есть в Excel-книге. Итоговая строка считается как отношение сумм, а не как среднее по очередям.



## Цены и основные предпосылки

| Параметр                     | Значение                      |
|------------------------------|-------------------------------|
| Стартовая цена квартир       | 600 тыс. ₹/м²                 |
| Стартовая цена коммерции     | 450 тыс. ₹/м²                 |
| Цена подземного машино-места | 3 000 тыс. ₹/шт.              |
| СМР наземной части           | 175 тыс. ₹/м² наземной части  |
| СМР подземной части          | 110 тыс. ₹/м² подземной части |
| Наружные инженерные сети     | 10,2 тыс. ₹/м² строит. объёма |
| Доля продаж до РВЭ           | 85,0%                         |
| Налог на прибыль             | 25,0%                         |

## Структура расходов

|                        |             |                        |
|------------------------|-------------|------------------------|
| Основное строительство | <div></div> | млрд ₹<br><b>75,45</b> |
| Отдельные объекты      | <div></div> | <b>54,06</b>           |
| Проценты и комиссии    | <div></div> | <b>22,96</b>           |
| Маркетинг и продажи    | <div></div> | <b>14,78</b>           |
| Социальная нагрузка    | <div></div> | <b>9,46</b>            |
| Резерв                 | <div></div> | <b>7,71</b>            |
| Прочие расходы         | <div></div> | <b>24,52</b>           |

| Статья                               | Сумма         | Доля   | тыс ₹/м² строит. объёма | тыс ₹/м² продаваемой |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------------------------|----------------------|
| Основное строительство               | 75,45 млрд ₹  | 36,1%  | 150,1                   | 293,2                |
| Отдельные объекты                    | 54,06 млрд ₹  | 25,9%  | 107,5                   | 210,1                |
| Проценты и комиссии                  | 22,96 млрд ₹  | 11,0%  | 45,7                    | 89,2                 |
| Маркетинг и продажи                  | 14,78 млрд ₹  | 7,1%   | 29,4                    | 57,4                 |
| Социальная нагрузка                  | 9,46 млрд ₹   | 4,5%   | 18,8                    | 36,8                 |
| Резерв                               | 7,71 млрд ₹   | 3,7%   | 15,3                    | 30,0                 |
| Технический заказчик / стройконтроль | 5,99 млрд ₹   | 2,9%   | 11,9                    | 23,3                 |
| ИРД и проектирование                 | 5,61 млрд ₹   | 2,7%   | 11,1                    | 21,8                 |
| Налог на прибыль                     | 3,77 млрд ₹   | 1,8%   | 7,5                     | 14,6                 |
| Управление проектом                  | 3,62 млрд ₹   | 1,7%   | 7,2                     | 14,0                 |
| НДС                                  | 3,14 млрд ₹   | 1,5%   | 6,2                     | 12,2                 |
| Цена приобретения                    | 2,40 млрд ₹   | 1,2%   | 4,8                     | 9,3                  |
| Итого расходы                        | 208,94 млрд ₹ | 100,0% | 415,6                   | 811,9                |

## Удельные расходы строительства

| Статья                                    | млн Р    | тыс Р/м <sup>2</sup><br>строительного<br>объёма | тыс Р/м <sup>2</sup> продаваемой |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| ИРД                                       | 351,8    | 0,70                                            | 1,37                             |
| Проектирование (П, РД) и авторский надзор | 5 253,7  | 10,45                                           | 20,42                            |
| Подготовка территории                     | 967,4    | 1,92                                            | 3,76                             |
| СМР наземной части                        | 45 242,2 | 89,98                                           | 175,81                           |
| СМР подземной части                       | 11 068,3 | 22,01                                           | 43,01                            |
| Наружные инженерные сети                  | 3 605,6  | 7,17                                            | 14,01                            |
| Благоустройство                           | 4 130,2  | 8,21                                            | 16,05                            |
| Сдача и ввод                              | 359,1    | 0,71                                            | 1,40                             |
| Содержание стройплощадки                  | 1 688,0  | 3,36                                            | 6,56                             |
| Вознаграждение генподрядчика              | 8 388,2  | 16,68                                           | 32,60                            |
| Технический заказчик / стройконтроль      | 5 991,6  | 11,92                                           | 23,28                            |
| Управление проектом                       | 3 615,4  | 7,19                                            | 14,05                            |
| Резерв                                    | 7 709,1  | 15,33                                           | 29,96                            |
| Итого строительство                       | 98 370,6 | 195,65                                          | 382,26                           |

Внутренние инженерные сети входят в СМР соответствующей части.

## Продажи и продукты


| Продукт           | Объём      | Темп до РВЭ | Стартовая цена | Средняя цена | Выручка       |
|-------------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Квартиры          | 140 218 м² | —           | 600 тыс. ₺     | 837 тыс. ₺   | 117,31 млрд ₺ |
| Коммерция 1 этажа | 12 392 м²  | —           | 450 тыс. ₺     | 627 тыс. ₺   | 7,78 млрд ₺   |
| Подземный паркинг | 1 855 шт.  | —           | 3 000 тыс. ₺   | 4 294 тыс. ₺ | 7,96 млрд ₺   |
| Офисы / МФОЦ      | 52 365 м²  | —           | 500 тыс. ₺     | 717 тыс. ₺   | 37,56 млрд ₺  |
| Коммерция ОСЗ     | 52 365 м²  | —           | 500 тыс. ₺     | 775 тыс. ₺   | 40,56 млрд ₺  |
| ДОУ               | 350 м²     | —           | 0 тыс. ₺       | 0 тыс. ₺     | 0,0 млн ₺     |
| СОШ               | 1 000 м²   | —           | 0 тыс. ₺       | 0 тыс. ₺     | 0,0 млн ₺     |

## Темп продаж квартир

| Показатель                         | Значение      |
|------------------------------------|---------------|
| Квартир в проекте                  | 2 389 шт.     |
| Средняя площадь квартиры           | 58,7 м²       |
| Средняя цена квартиры              | 49,1 млн ₺    |
| Темп до РВЭ                        | 38,2 кв./мес. |
| Средний темп за весь период продаж | 36,2 кв./мес. |
| Пиковый месяц                      | 63,1 кв.      |
| Длительность продаж                | 66 мес.       |

Штуки пересчитаны из помесячных продаж по средней площади квартиры из ТЭП: изменится нарезка — изменится и темп.

## Месячный темп продаж квартир, шт.

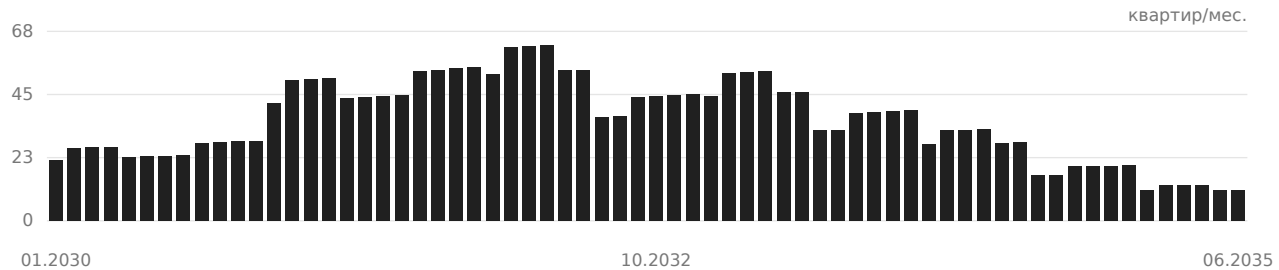

## Финансирование и динамика проекта

| Показатель                                       | Значение      |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Расчётный БРИДЖ                                  | 8,27 млрд ₽   |
| Пиковый фактический БРИДЖ (тело долга)           | 30,19 млрд ₽  |
| Собственные средства до ПФ                       | 0,0 млн ₽     |
| Пик БРИДЖ с капитализацией процентов (справочно) | 40,60 млрд ₽  |
| Пиковая (непокрытая эскроу) задолженность ПФ     | 6,80 млрд ₽   |
| Долг ПФ перед раскрытием в РВЭ                   | 177,70 млрд ₽ |
| Раскрытый эскроу в РВЭ                           | 187,98 млрд ₽ |
| Остаток ПФ после раскрытия в РВЭ                 | 6,71 млрд ₽   |
| Лимит ПФ                                         | 179,09 млрд ₽ |
| Текущая ключевая ставка                          | 14,0%         |
| Спред БРИДЖ                                      | 6,0%          |
| Ставка БРИДЖ на текущей ключевой                 | 20,0%         |
| Средняя ключевая за период БРИДЖ                 | 9,0%          |
| Средневзвешенная ставка БРИДЖ за период          | 15,0%         |
| Средняя фактическая ставка ПФ                    | 3,9%          |
| Проценты и комиссии                              | 22,96 млрд ₽  |
| Непогашенный долг ПФ на конец проекта            | 0,0 млн ₽     |
| LLCR                                             | 1,01x         |

## Структура расчётного БРИДЖА


| Цель                       | Сумма       | Доля   |
|----------------------------|-------------|--------|
| Приобретение проекта       | 2,40 млрд ₽ | 29,1%  |
| Социальная компенсация     | 768,2 млн ₽ | 9,3%   |
| Проектирование - стадия П  | 2,11 млрд ₽ | 25,5%  |
| Проектирование - стадия РД | 2,99 млрд ₽ | 36,1%  |
| ИТОГО БРИДЖ                | 8,27 млрд ₽ | 100,0% |

## Структура фактического БРИДЖА · 01.12.2031


| Статья                                  | Оплачено к пику | Доля    |
|-----------------------------------------|-----------------|---------|
| МФОЦ / офисы                            | 19,49 млрд ₽    | 64,6%   |
| Основное строительство, наземная часть  | 15,37 млрд ₽    | 50,9%   |
| Социальная нагрузка                     | 9,46 млрд ₽     | 31,3%   |
| ТЦ / коммерция ОСЗ                      | 7,02 млрд ₽     | 23,2%   |
| Основное строительство, подземная часть | 2,74 млрд ₽     | 9,1%    |
| Покупка / цена входа                    | 2,40 млрд ₽     | 8,0%    |
| Проектирование, стадия РД               | 2,31 млрд ₽     | 7,7%    |
| Резерв                                  | 1,72 млрд ₽     | 5,7%    |
| Вознаграждение генподрядчика            | 1,69 млрд ₽     | 5,6%    |
| Проектирование, стадия П                | 1,63 млрд ₽     | 5,4%    |
| Наружные инженерные сети                | 1,49 млрд ₽     | 4,9%    |
| Управление проектом                     | 1,30 млрд ₽     | 4,3%    |
| Технический заказчик / стройконтроль    | 1,21 млрд ₽     | 4,0%    |
| Благоустройство                         | 846,5 млн ₽     | 2,8%    |
| Подготовительные работы                 | 747,7 млн ₽     | 2,5%    |
| Содержание стройплощадки                | 529,7 млн ₽     | 1,8%    |
| ИРД и согласования                      | 325,1 млн ₽     | 1,1%    |
| Сдача и ввод                            | 73,6 млн ₽      | 0,2%    |
| Авторский надзор                        | 63,2 млн ₽      | 0,2%    |
| Покрыто выручкой и ПФ                   | -40,23 млрд ₽   | -133,3% |
| ПИК БРИДЖА                              | 30,19 млрд ₽    | 100,0%  |

Оплачено к месяцу пика. До открытия ПФ у проекта нет ни выручки, ни ПФ, поэтому остаток БРИДЖа равен оплаченному; разница с расчётным лимитом — расходы, под которые лимит не даётся.

## Долг и наполнение эскроу

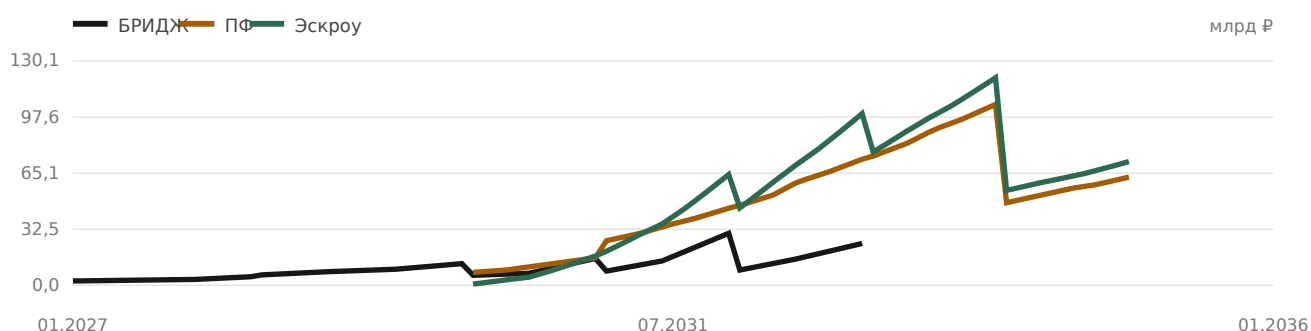


## Ставки финансирования

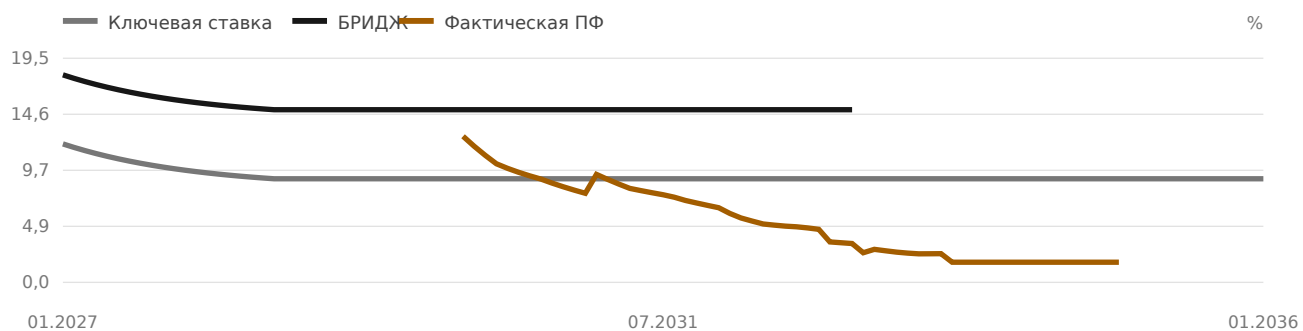

## Чувствительность проекта

Показатель: LLCR · база 0,854 х · охват: Очередь 2 · отклонение 10% и 6 мес. для сроков. Меняется один параметр за расчёт.

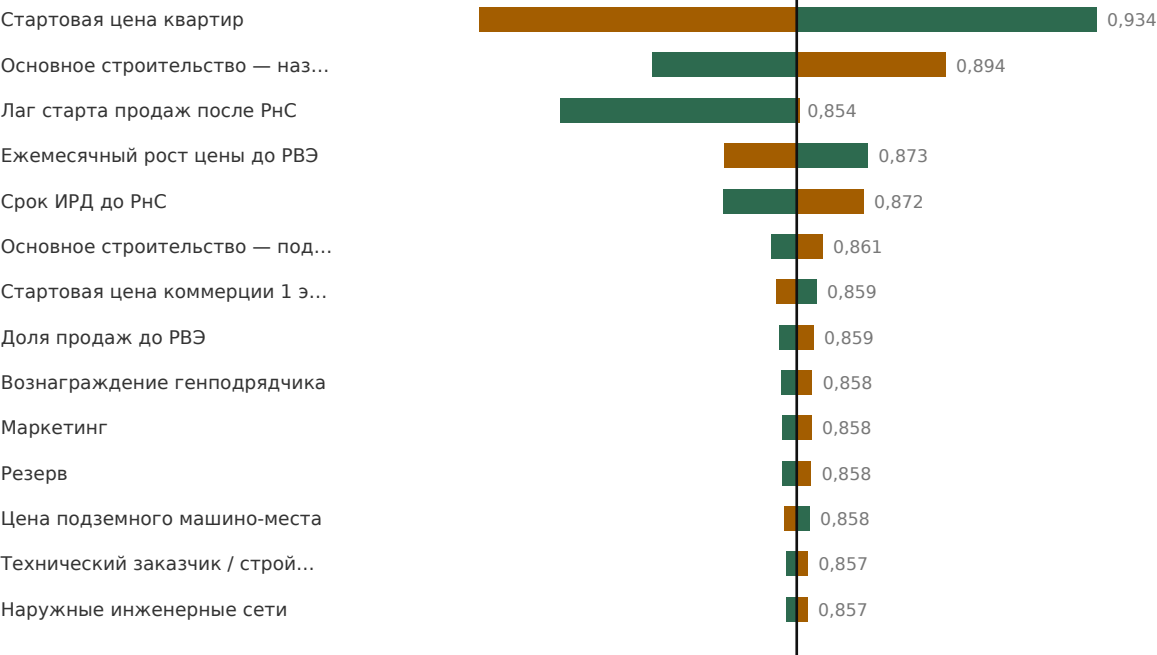

| Параметр                                         | Ниже  | Выше  | Размах |
|--------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| Стартовая цена квартир                           | 0,770 | 0,934 | 0,164  |
| Основное строительство — наземная часть          | 0,894 | 0,816 | 0,078  |
| Лag старта продаж после РnС                      | 0,854 | 0,792 | 0,063  |
| Ежемесячный рост цены до РВЭ                     | 0,835 | 0,873 | 0,038  |
| Срок ИРД до РnС                                  | 0,872 | 0,835 | 0,037  |
| Основное строительство — подземная часть         | 0,861 | 0,847 | 0,014  |
| Стартовая цена коммерции 1 этажа                 | 0,849 | 0,859 | 0,011  |
| Доля продаж до РВЭ                               | 0,859 | 0,850 | 0,009  |
| Вознаграждение генподрядчика                     | 0,858 | 0,850 | 0,008  |
| Маркетинг                                        | 0,858 | 0,850 | 0,008  |
| Резерв                                           | 0,858 | 0,850 | 0,008  |
| Цена подземного машино-места                     | 0,851 | 0,858 | 0,007  |
| Технический заказчик / стройконтроль (технадзор) | 0,857 | 0,851 | 0,006  |
| Наружные инженерные сети                         | 0,857 | 0,851 | 0,006  |

Наибольшее влияние на «LLCR» оказывает параметр «Стартовая цена квартир»: отклонение на 10% меняет показатель с 0,854 до 0,770 в худшую сторону (размах 0,164 х).

Далее по значимости: «Основное строительство — наземная часть», «Лag старта продаж после РnС».

Базовый LLCR 0,854х уже ниже целевых 1,20х — целевой уровень не держится и без отклонений.

Tornado меняет параметры по одному. Сочетание нескольких отклонений сразу здесь не показано и обычно хуже любого из них по отдельности.

## Календарный план проекта

| Этап / событие                                         | 2027        |    |    |    | 2028 |    |    |    | 2029 |    |    |    | 2030 |    |    |    | 2031 |    |    |    | 2032 |    |    |    | 2033 |    |    |    | 2034 |    |    |    | 2035 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|--|--|--|
|                                                        | Q1          | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Ключевые вехи                              |             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Сделка / начало прое...<br>01.2027         | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Подготовка                                 |             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · ИРД и согласования<br>01.2027—01.2030      | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Проектирование П и РД<br>07.2029—01.2030   | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Финансирование                             |             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · БРИДЖ<br>01.2027—01.2030                   | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Ключевые вехи                              |             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · РНС<br>01.2030                             | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Старт продаж<br>01.2030                    | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Строительство                              |             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Строительство ЖК<br>01.2030—01.2032        | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Сети и благоустройство<br>01.2030—01.2032  | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Социальная нагрузка                        |             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · ДОУ<br>01.2027—01.2029                     | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Продажи                                    |             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Продажи<br>01.2030—06.2032                 | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Ключевые вехи                              |             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · РВЭ / РНВ<br>01.2032                       | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Окончание продаж<br>06.2032                | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Финансирование                             |             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 1 · Проектное финансиров...<br>01.2030—06.2032 | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 2 · Ключевые вехи                              |             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 2 · Сделка / начало прое...<br>01.2028         | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 2 · Подготовка                                 |             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 2 · ИРД и согласования<br>01.2028—01.2031      | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 2 · Проектирование П и РД<br>07.2030—01.2031   | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 2 · Финансирование                             |             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 2 · БРИДЖ<br>01.2028—01.2031                   | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 2 · Ключевые вехи                              |             |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |
| Очередь 2 · РНС<br>01.2031                             | <div></div> |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |  |  |



## Календарный план проекта · продолжение

| Этап / событие                                           | 2027 |    |    |    | 2028 |    |    |    | 2029 |    |    |    | 2030 |    |    |    | 2031 |    |    |    | 2032 |    |    |    | 2033 |    |    |    | 2034 |    |  |  | 2035 |  |
|----------------------------------------------------------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|--|--|------|--|
|                                                          | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 |  |  |      |  |
| Очередь 2 · КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ                                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 2 · Старт продаж<br>01.2031                      |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 2 · СТРОИТЕЛЬСТВО                                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 2 · Строительство ЖК<br>01.2031—01.2033          |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 2 · Сети и благоустройство<br>01.2031—01.2033    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 2 · СОЦИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА                          |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 2 · СОШ<br>01.2028—07.2030                       |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 2 · ПРОДАЖИ                                      |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 2 · Продажи<br>01.2031—06.2033                   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 2 · КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ                                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 2 · РВЭ / РНВ<br>01.2033                         |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 2 · Окончание продаж<br>06.2033                  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 2 · ФИНАНСИРОВАНИЕ                               |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 2 · Проектное финансирован...<br>01.2031—06.2033 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · ОФИСЫ · КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ                        |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · офисы · Сделка / нач...<br>01.2029           |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · ОФИСЫ · ПОДГОТОВКА                           |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · офисы · ИРД и соглас...<br>01.2029—01.2032   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · офисы · Проектирован...<br>07.2031—01.2032   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · ОФИСЫ · ФИНАНСИРОВАНИЕ                       |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · офисы · БРИДЖ<br>01.2029—01.2032             |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · ОФИСЫ · КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ                        |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · офисы · РНС<br>01.2032                       |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · офисы · Старт продаж<br>01.2032              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · ОФИСЫ · СТРОИТЕЛЬСТВО                        |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · офисы · Строительств...<br>01.2032—01.2034   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · офисы · Сети и благо...<br>01.2032—01.2034   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · ОФИСЫ · ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ                    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · офисы · Офисы / МФОЦ<br>07.2030—07.2032      |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · ОФИСЫ · ПРОДАЖИ                              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |
| Очередь 3 · офисы · Продажи<br>01.2032—06.2034           |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |

Календарный план проекта · продолжение

| Этап / событие                           | 2027 |    |    |    | 2028 |    |    |    | 2029 |    |    |    | 2030 |    |    |    | 2031 |    |    |    | 2032 |    |    |    | 2033 |    |    |    | 2034 |    |  |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------------------------------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|                                          | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| ОЧЕРЕДЬ 3 · ОФИСЫ · КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ        |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| Очередь 3 · офисы · РВЭ / РНВ<br>01.2034 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

Полосы построены по фактическим датам модели; ромбами отмечены ключевые вехи. При включённой очередности этапы каждой очереди показаны отдельными строками.

Отчёт сформирован автоматически DevelopAid на основании текущих вводных модели. Перед инвестиционным решением требуется проверка исходных данных, юридических предпосылок и условий кредитования.
