Сводка по проекту «Гродненская»

за неделю 12.10 — 18.10.2026

Главное за период

Стройка

Выполнено 50,0% работ по графику при плане 58,0% — отставание 8,0 п. п. За неделю отставание сократилось на 14,8 п. п.

Источник: ГПР-факт от 16.10.2026

Люди на площадке

В среднем 54 рабочих и 16 ИТР в день, максимум 62 — по 4 отчётам из 7 дней периода; в предыдущий такой же период — 69 (−21%).

Источник: ежедневные отчёты со стройки (бот)

Отстающие работы

Больше всего отстают: Фасад (Корпус 2) — 12,8 п. п.; Монолит (Корпус 1) — 5,6 п. п.

Источник: ГПР-факт от 16.10.2026

Срок

Прогноз ввода при нынешнем темпе — 15.01.2027; утверждённого срока ввода в данных Монитора нет, сравнить не с чем.

Источник: прогноз Монитора по темпу работ

Бюджет месяца

Стройка и проектирование — оплачено 200,0 млн ₽ из 400,0 млн ₽ (50,0%), осталось 200,0 млн ₽; коммерческие расходы — оплачено 7,0 млн ₽ из 25,0 млн ₽ (28,0%), осталось 18,0 млн ₽; по нынешнему темпу к концу месяца стройке оплатят около 344,4 млн ₽ — на 55,6 млн ₽ меньше плана. Прошло 58,1% месяца.

Источник: план-факт БДДС от 02.10.2026, РСС от 18.10.2026

Продажи

С начала квартала продано 3 договора на 45,0 млн ₽, 180 м²; план финмодели выполнен на 37,5% (меньше на 75,0 млн ₽, 300 м²); план банка выполнен на 34,6% (меньше на 85,0 млн ₽, 340 м²). За неделю — 30,0 млн ₽, за предыдущий такой же период — 15,0 млн ₽. Продано 39,6% площади, осталось 580 м².

Источник: контрактация от 20.10.2026, планы ФМ и банка

Финансирование

Выборка кредита за неделю — 48,0 млн ₽ (за предыдущий такой же период — 120,0 млн ₽); эскроу очереди «1 очередь» покроет кредит на 1,05× по плану и на 1,40× при нынешнем темпе; на эскроу за октябрь 2026 поступило 5,0 млн ₽.

Источник: РСС от 18.10.2026, карточка финансирования Монитора, план «КРЕДИТЫ»

Открытые вопросы

Открытых вопросов: 1, новых или изменённых за неделю: 1 — «Арбитраж с подрядчиком».


Источник: общая информация по проекту

Стройка

	План к дате	Выполнено	Отставание
Весь проект	58,0%	50,0%	−8,0 п. п.
Корпус 1	60,6%	55,0%	−5,6 п. п.
Корпус 2	52,8%	40,0%	−12,8 п. п.

За неделю выполнение выросло на 20,0 п. п. Проценты — из графика работ от 16.10.2026.

Выполнение по графику работ: план и факт на дату каждого ГПР-факта

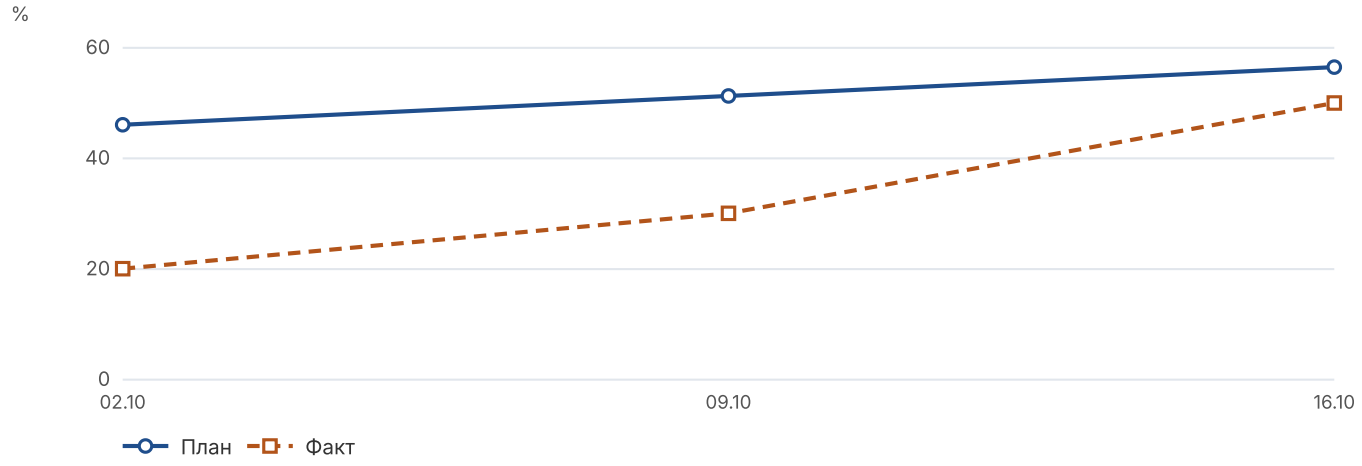

Больше всего отстают (с отставанием 2 работы)


Работа	Объект	План к дате	Выполнено	Отставание	Окончание по плану
Фасад	Корпус 2	52,8%	40,0%	−12,8 п. п.	29.11.2026
Монолит	Корпус 1	60,6%	55,0%	−5,6 п. п.	28.12.2026

Люди на площадке

	За неделю	Предыдущий такой же период
Дней с отчётом	4 из 7	3
Рабочих в среднем в день	54	69
Рабочих максимум	62	72
ИТР в среднем в день	16	16

Подрядчик	Рабочих в среднем	ИТР в среднем	Дней в отчётах
НУР	36	11	4
Клодо (кладка)	12	2	4
СПМ	6	3	4

Рабочих на площадке по дням (пропуск — дня без отчёта)

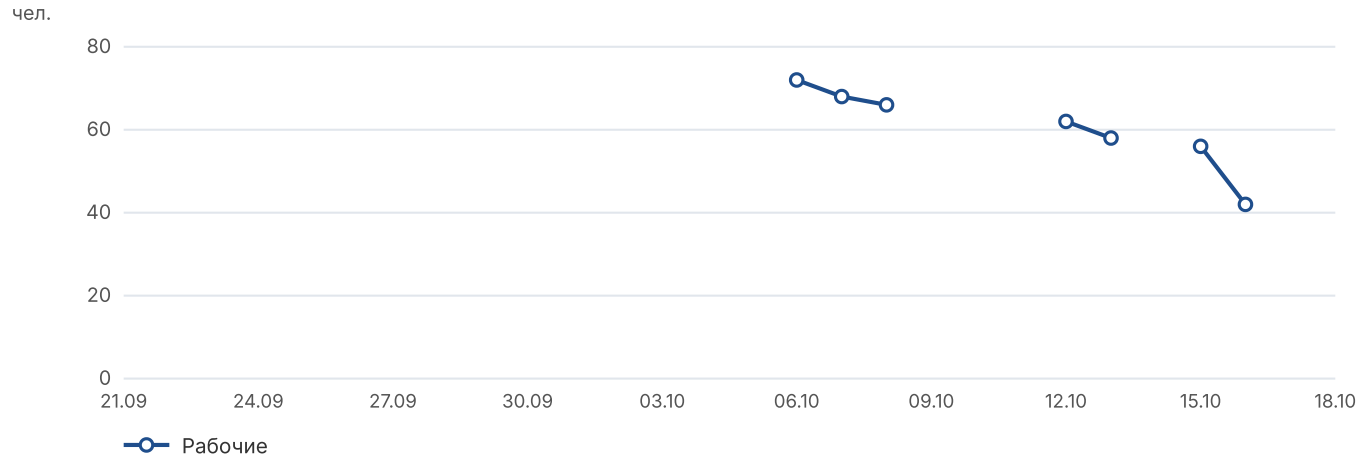

Плановой численности в графике работ нет — сравнение с планом не приводится.


Ввод: утверждённого срока в данных нет, прогноз Монитора при нынешнем темпе 15.01.2027.

Продажи

Факт	Договоров	Сумма	Площадь	Цена квартир, ₽/м²
За неделю	2	30,0 млн ₽	120 м²	250 000 ₽
С начала месяца (октябрь 2026)	3	45,0 млн ₽	180 м²	250 000 ₽
С начала квартала (4 квартал 2026)	3	45,0 млн ₽	180 м²	250 000 ₽

План	Сумма	Площадь
План финмодели на месяц	40,0 млн ₽	160 м²
План финмодели на квартал	120,0 млн ₽	480 м²
План банка на квартал	130,0 млн ₽	520 м²


Продажи нарастающим итогом по кварталам, сумма договоров

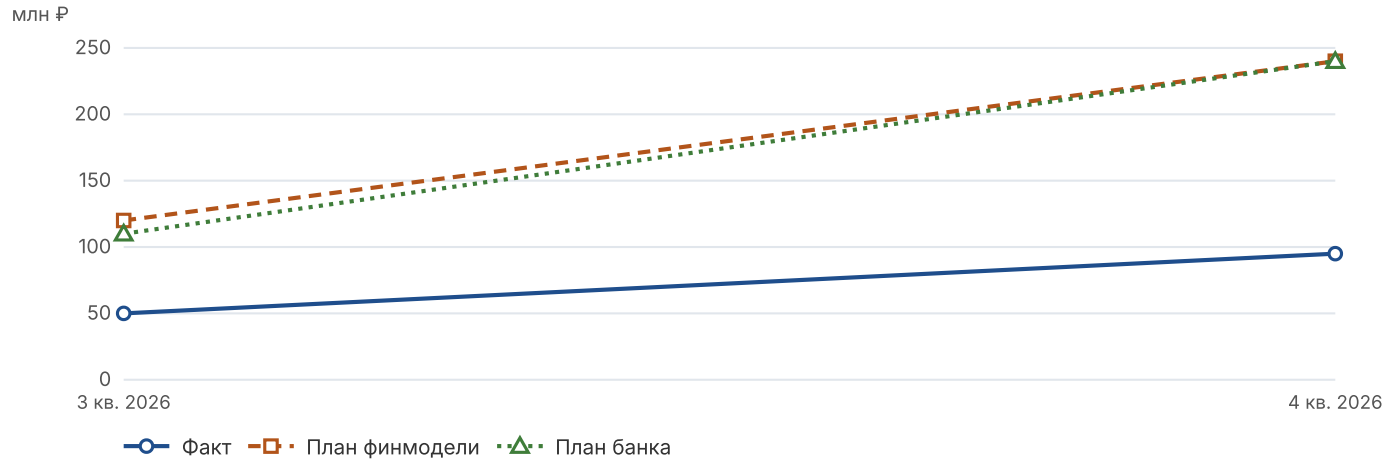


По типам помещений

Тип	За неделю: лотов	м²	сумма	С начала продаж: лотов	м²	сумма	Средняя цена	План ФМ на квартал
Квартира	2	120 м²	30,0 млн ₽	5	380 м²	95,0 млн ₽	250 000 ₽ за м²	0 ₽

Темп продаж: м² договоров по месяцам

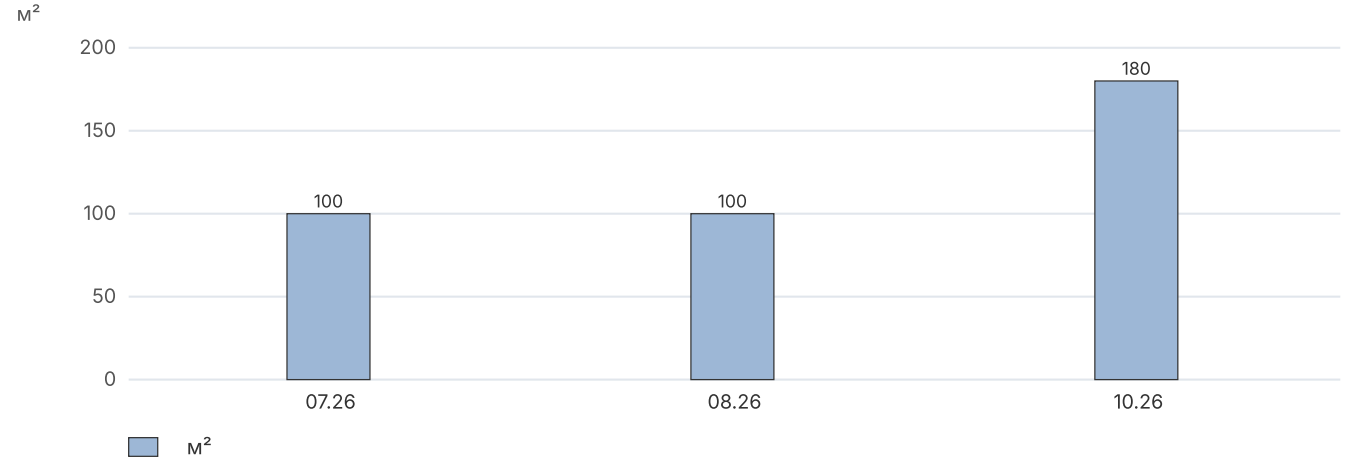

Средняя цена квартир по месяцам

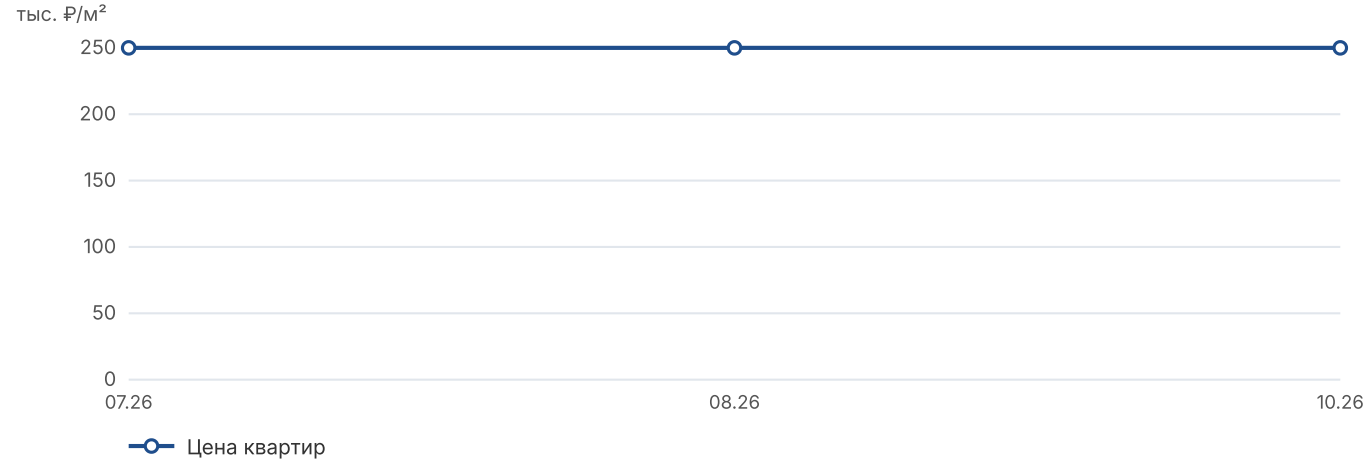

Формы оплаты (с начала продаж)

Форма оплаты	Договоров	Сумма	Доля
дефект заполнения CRM	5	95,0 млн ₽	100,0%

Остаток нераспроданного

Тип	Продано лотов	Всего лотов	Продано м²	Всего м²	Осталось м²
Квартира	5	—	380 м²	960 м²	580 м²

Финансирование


Лимит и дефицит не посчитаны: не загружен финансовый baseline.

	За неделю	С начала месяца	С начала проекта
Выборка кредита (платежи из заёмных средств)	48,0 млн ₽	168,0 млн ₽	448,0 млн ₽
Услуги банка, статья 3.5 (в том числе проценты)	18,0 млн ₽	18,0 млн ₽	18,0 млн ₽

Эскроу, очередь	Месяц	Накоплено	План	Покрытие кредита по плану	При нынешнем темпе
1 очередь	сентябрь 2026	60,0 млн ₽	45,0 млн ₽	1,05×	1,40×


Платежи — из отчёта РСС от 18.10.2026.

Выборка кредита и эскроу нарастающим итогом по месяцам

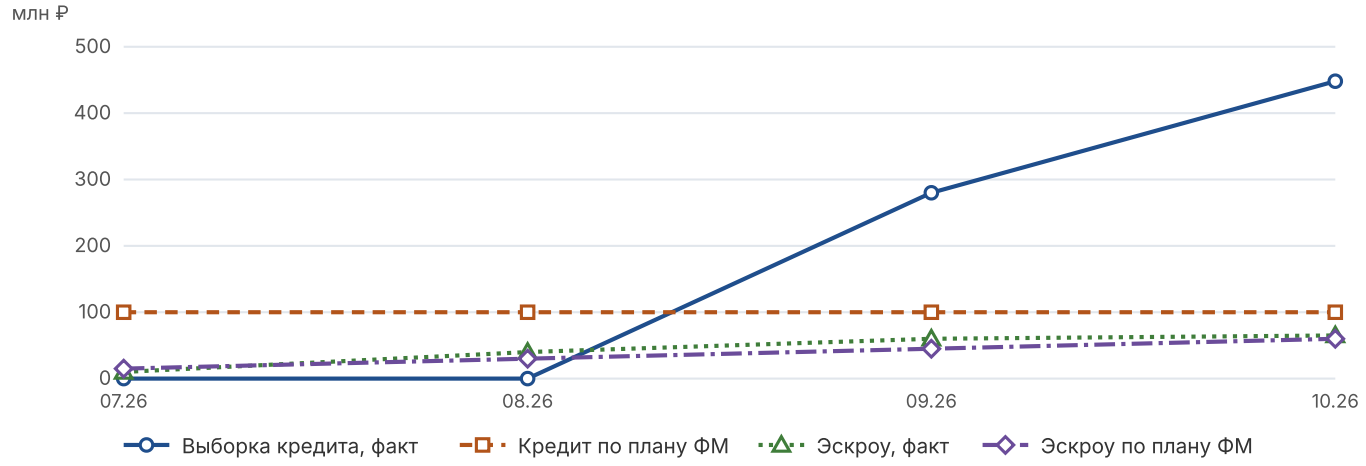

Поступления на эскроу по графикам договоров: за октябрь 2026 — 5,0 млн ₽, всего — 65,0 млн ₽. Поступления видны помесячно, поэтому за неделю их не выделить.

Покрытие кредита эскроу: факт и план по месяцам

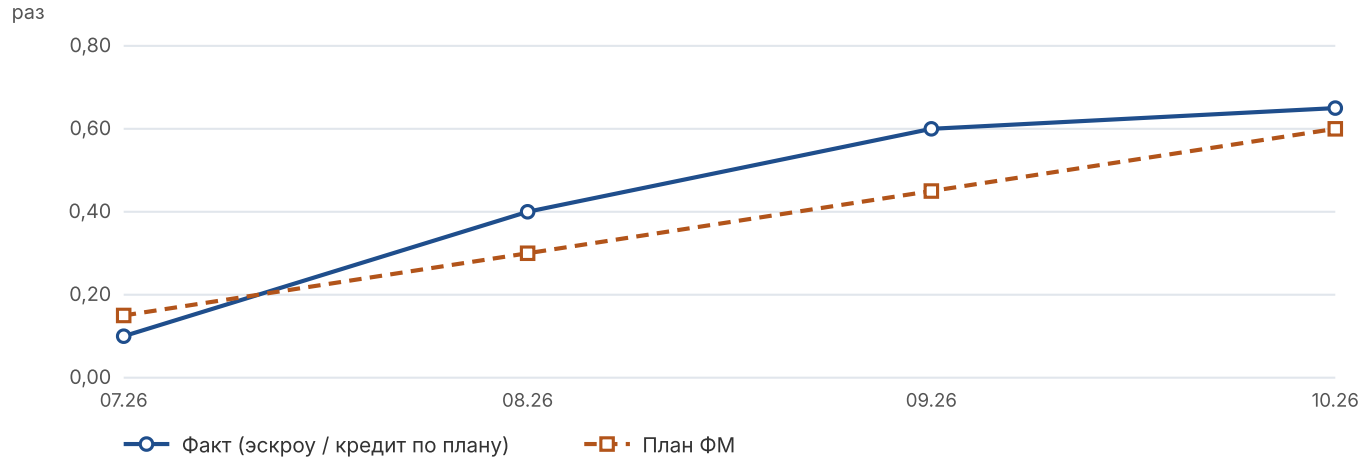


Бюджет месяца

октябрь 2026

Статья	План	Оплачено	Осталось
Стройка и проектирование	400,0 млн ₽	200,0 млн ₽	200,0 млн ₽
Коммерческие расходы	25,0 млн ₽	7,0 млн ₽	18,0 млн ₽
Служба заказчика, охрана и офис	—	0 ₽	—

Оплаты — из отчёта РСС от 18.10.2026.


Бюджет на октябрь 2026: план и оплачено по статьям

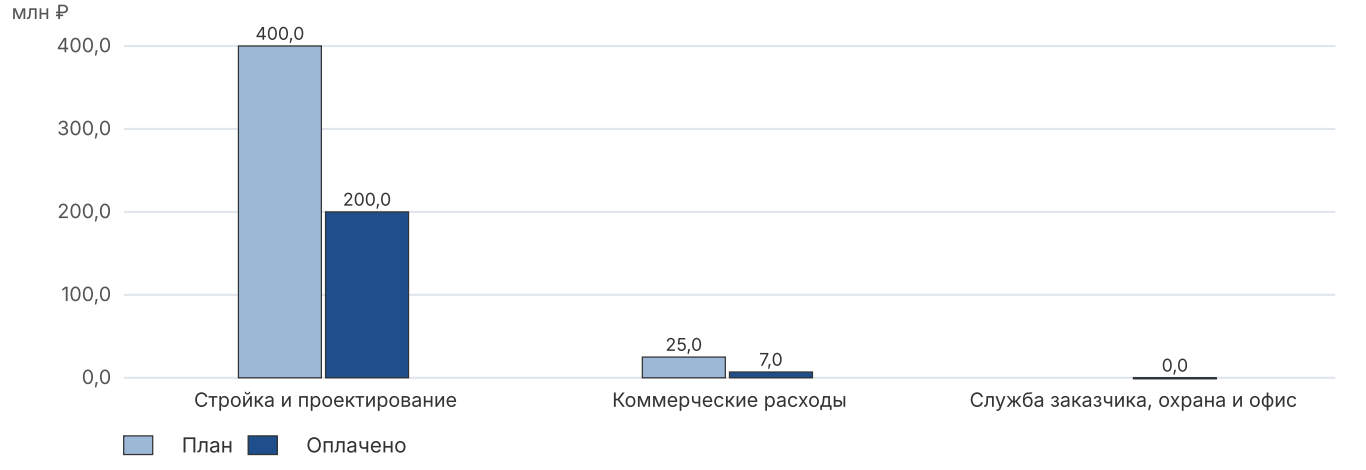

Прогноз освоения до конца месяца по нынешнему темпу

Строка	План месяца	Оплачено	Прогноз к концу месяца	Против плана
Стройка и проектирование	400,0 млн ₽	200,0 млн ₽	344,4 млн ₽	−55,6 млн ₽
Коммерческие расходы	25,0 млн ₽	7,0 млн ₽	12,1 млн ₽	−12,9 млн ₽

Стройка и проектирование: план и оплачено по месяцам

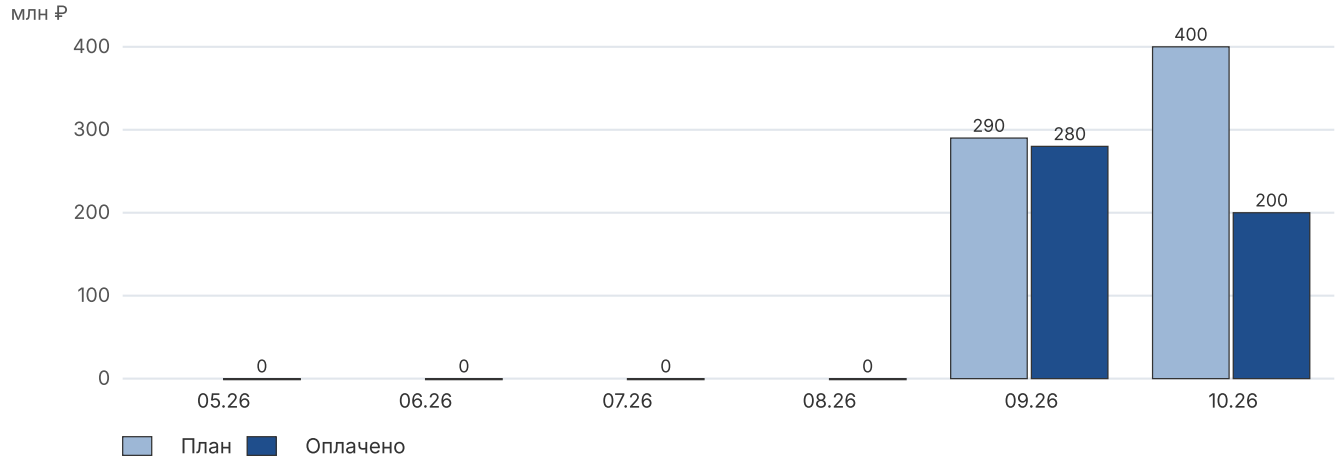

Месяц	Стройка: план	Стройка: оплачено	Коммерция: план	Коммерция: оплачено
май 2026	—	0 ₽	—	0 ₽
июнь 2026	—	0 ₽	—	0 ₽
июль 2026	—	0 ₽	—	0 ₽
август 2026	—	0 ₽	—	0 ₽
сентябрь 2026	290,0 млн ₽	280,0 млн ₽	20,0 млн ₽	0 ₽
октябрь 2026	400,0 млн ₽	200,0 млн ₽	25,0 млн ₽	7,0 млн ₽

Отклонения по статьям бюджета: в файле бюджета нет группировки строк по уровням.

Оплачено с начала месяца по статьям РСС

Код	Статья РСС	Оплачено
2.2.1.4		150,0 млн ₽
3.1		7,0 млн ₽

Крупнейшие получатели оплат с начала месяца

Контрагент	Оплачено
СтройКо	157,0 млн ₽

Общая информация

Арбитраж с подрядчиком (новое): Иск подан, заседание 12.11 — 14.10.2026, Иван Иванов
