Сводка по проекту «Гродненская»

за неделю 12.10 — 18.10.2026

1. Главное за период
2. Стройка
3. Продажи
4. Финансирование
5. Бюджет месяца
6. Споры и претензии
7. Общая информация

СТРОЙКА: ВЫПОЛНЕНО
50,0%
план 58,0%, −8,0 п. п.

РАБОЧИХ В СРЕДНЕМ В ДЕНЬ
нет данных
отчётов со стройки за период нет

ПРОДАЖИ КВАРТАЛА К ПЛАНУ ФИНМОДЕЛИ
нет данных
плана нет

ПРОДАЖИ КВАРТАЛА К ПЛАНУ БАНКА
нет данных
плана нет

УТВЕРЖДЁННЫЙ БЮДЖЕТ
нет данных
финансовая книга не загружена

ЛИМИТ БАНКА
нет данных
не загружен финансовый baseline

ВЫБРАНО У БАНКА
448,0 млн ₽
за неделю — 48,0 млн ₽

ОСТАТОК ЛИМИТА БАНКА
нет данных
лимит не посчитан

ДЕФИЦИТ НА ДОСТРОЙКУ
нет данных
утверждённый бюджет не загружен

ЭСКРОУ ПРИ НЫНЕШНЕМ ТЕМПЕ
1,40×
покрывает кредит; по плану финмодели 1,05×

БЮДЖЕТ СТРОЙКИ ЗА МЕСЯЦ
37,5%
оплачено 150,0 млн ₽ из 400,0 млн ₽; прошло 58,1% месяца

БЮДЖЕТ КОММЕРЦИИ ЗА МЕСЯЦ
28,0%
оплачено 7,0 млн ₽ из 25,0 млн ₽; прошло 58,1% месяца

Главное за период

- **Стройка.** Выполнено 50,0% работ по графику при плане 58,0% — отставание 8,0 п. п. За неделю отставание сократилось на 14,8 п. п. Источник: ГПР-факт от 16.10.2026.
- ***Люди на площадке.*** *Ежедневные отчёты со стройки не приходили: чат стройки не связан с ботом или отчётов ещё не было.*
- **Отстающие работы.** Больше всего отстают: Фасад (Корпус 2) — 12,8 п. п.; Монолит (Корпус 1) — 5,6 п. п. Источник: ГПР-факт от 16.10.2026.
- **Срок.** Прогноз ввода при нынешнем темпе — 15.01.2027; утверждённого срока ввода в данных Монитора нет, сравнить не с чем. Источник: прогноз Монитора по темпу работ.
- **Корпуса.** Сильнее всех опаздывает Корпус 2: работы по прогнозу закончатся 27.12.2026 — на 28 дн. позже утверждённого графика; всего с опозданием 2 корпуса. Источник: график Монитора по корпусам, прогноз по темпу.
- **Бюджет месяца.** По стройке и коммерческим расходам оплачено 157,0 млн ₽ из 425,0 млн ₽ (36,9%), осталось 268,0 млн ₽; стройка и проектирование — оплачено 150,0 млн ₽ из 400,0 млн ₽ (37,5%); коммерческие расходы — оплачено 7,0 млн ₽ из 25,0 млн ₽ (28,0%); по нынешнему темпу к концу месяца стройке оплатят около 258,3 млн ₽ — на 141,7 млн ₽ меньше плана. Прошло 58,1% месяца. Источник: план-факт БДДС от 02.10.2026, РСС от 18.10.2026.
- **Продажи.** С начала квартала продано 0 договоров на 0 ₽, 0 м². За неделю — 0 ₽, за предыдущий такой же период — 0 ₽. Источник: контрактация от 22.10.2026, планы ФМ и банка.
- **Финансирование.** Выборка кредита за неделю — 48,0 млн ₽ (за предыдущий такой же период — 120,0 млн ₽); при нынешнем темпе эскроу очереди «1 очередь» покрывает кредит (1,40×), по плану финмодели — 1,05×; на эскроу за октябрь 2026 поступило 5,0 млн ₽. Источник: РСС от 18.10.2026, карточка финансирования Монитора, план «КРЕДИТЫ».
- ***Споры.*** *Споры в реестр пока не внесены, поэтому в сводке их нет. Загрузите документы спора на странице сводки, проверьте карточку, которую предложит Платон, и подтвердите её.* *Источник: реестр споров.*
- **Открытые вопросы.** Открытых вопросов: 1, новых или изменённых за неделю: 1 — «Арбитраж с подрядчиком». Источник: общая информация по проекту.


Стройка

	План к дате	Выполнено	Отставание
Весь проект	58,0%	50,0%	−8,0 п. п.
Корпус 1	60,6%	55,0%	−5,6 п. п.
Корпус 2	52,8%	40,0%	−12,8 п. п.

За неделю выполнение выросло на 20,0 п. п.

Проценты — ГПР-факт от 16.10.2026: то же, что показывает Монитор на эту дату.

Выполнение по графику работ: план и факт на дату каждого ГПР-факта

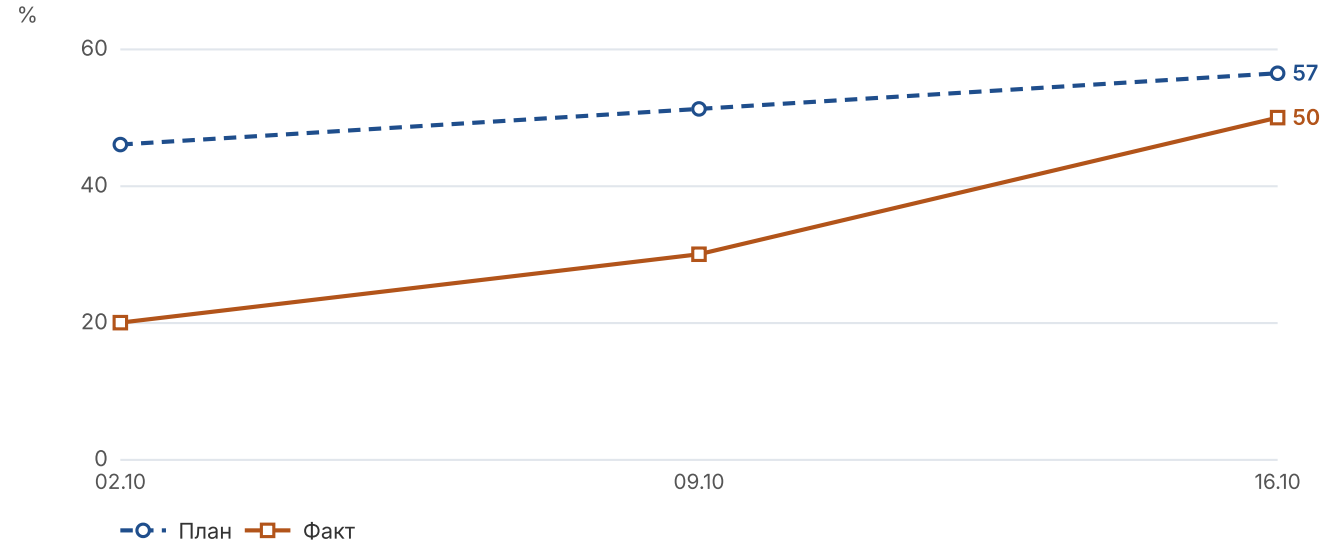

Больше всего отстают (с отставанием 2 работы)


Работа	Объект	План к дате	Выполнено	Отставание	Окончание по плану
Фасад	Корпус 2	52,8%	40,0%	−12,8 п. п.	29.11.2026
Монолит	Корпус 1	60,6%	55,0%	−5,6 п. п.	28.12.2026

Люди на площадке

Ежедневные отчёты со стройки не приходили: чат стройки не связан с ботом или отчётов ещё не было.

Сроки работ по корпусам

Сроки работ по корпусам: утверждённый график и прогноз по темпу

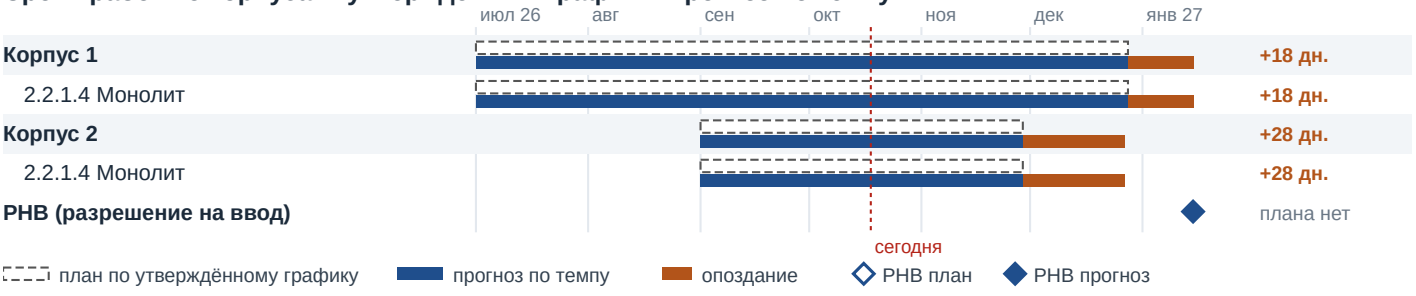

Утверждённой даты РНВ в данных нет: она берётся из выгрузки планировщика с сетью работ, а её в Монитор не загружали.

Ввод: утверждённого срока в данных нет, прогноз Монитора при нынешнем темпе 15.01.2027.

Продажи

Факт	Договоров	Сумма	Площадь квартир и помещений	Машиноместа и кладовые	Цена квартир, ₽/м²
За неделю	0	0 ₽	0 м²	—	—
С начала месяца (октябрь 2026)	0	0 ₽	0 м²	—	—
С начала квартала (4 квартал 2026)	0	0 ₽	0 м²	—	—

План банка не загружен.


Продажи нарастающим итогом по кварталам, сумма договоров



По типам помещений

Тип	За неделю: лотов	м²	сумма	С начала продаж: лотов	м²	сумма	Средняя цена	План ФМ на квартал
Квартира	0	0 м²	0 ₽	2	200 м²	50,0 млн ₽	250 000 ₽ за м²	—

Темп продаж: м² договоров по месяцам

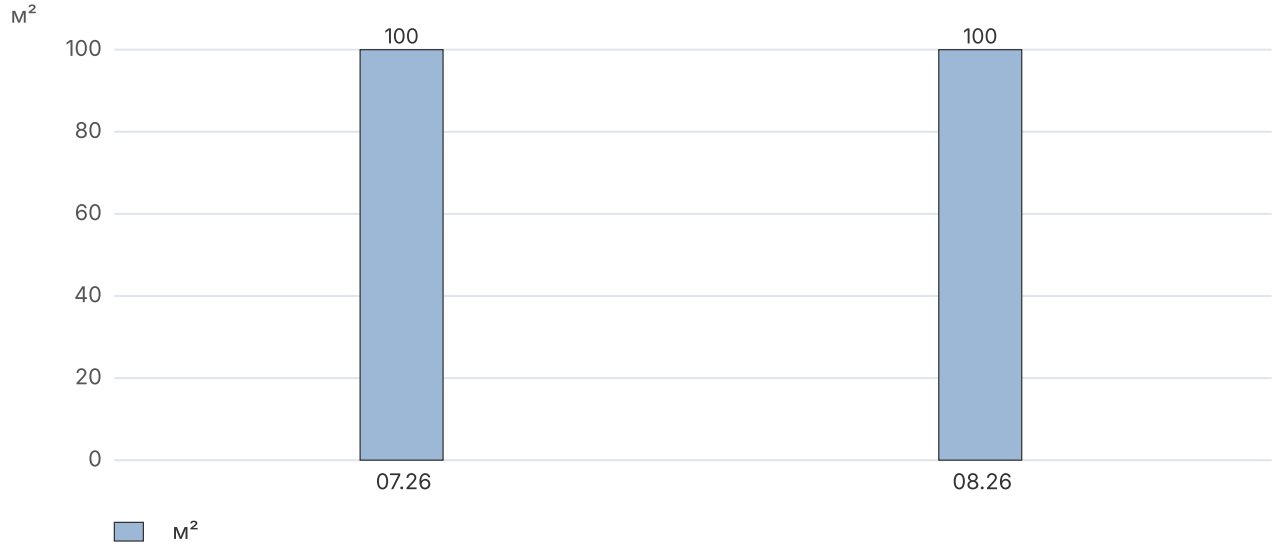

Средняя цена квартир по месяцам



Формы оплаты (с начала продаж)

Форма оплаты	Договоров	Сумма	Доля
дефект заполнения CRM	2	50,0 млн ₽	100,0%

Остаток нераспроданного не посчитан: в отчёте о продажах нет квартирографии или плана финмодели по объёмам.

Финансирование

Лимит и дефицит не посчитаны: не загружен финансовый baseline.


	За неделю	С начала месяца	С начала проекта
Выборка кредита (платежи из заёмных средств)	48,0 млн ₽	168,0 млн ₽	448,0 млн ₽
Услуги банка, статья 3.5 (в том числе проценты)	18,0 млн ₽	18,0 млн ₽	18,0 млн ₽

План банка не загружен: в книге проекта нужен лист «План банка_new» или «Модель банка_new».

Эскроу, очередь	Месяц	Накоплено	План финмодели («КРЕДИТЫ»)	Покрытие кредита по плану	При нынешнем темпе
1 очередь	сентябрь 2026	60,0 млн ₽	45,0 млн ₽	1,05×	1,40×


Платежи — из отчёта РСС от 18.10.2026.

Выборка кредита и эскроу нарастающим итогом по месяцам

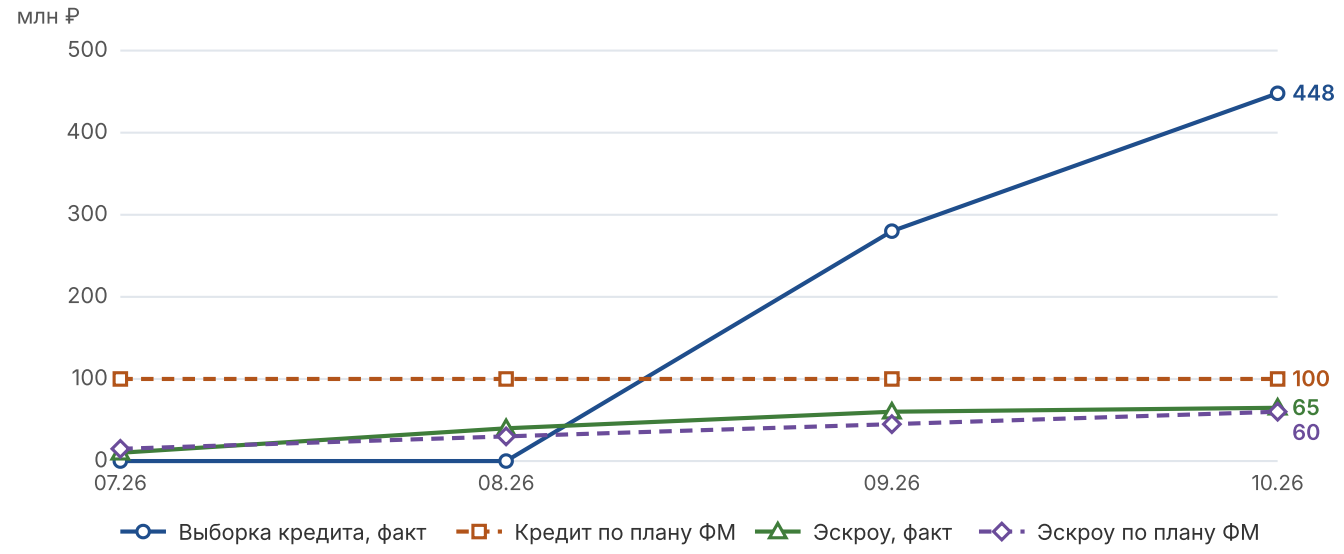

Поступления на эскроу по графикам договоров: за октябрь 2026 — 5,0 млн ₽, всего — 65,0 млн ₽. Поступления видны помесячно, поэтому за неделю их не выделить.

Покрытие кредита эскроу: факт и план по месяцам

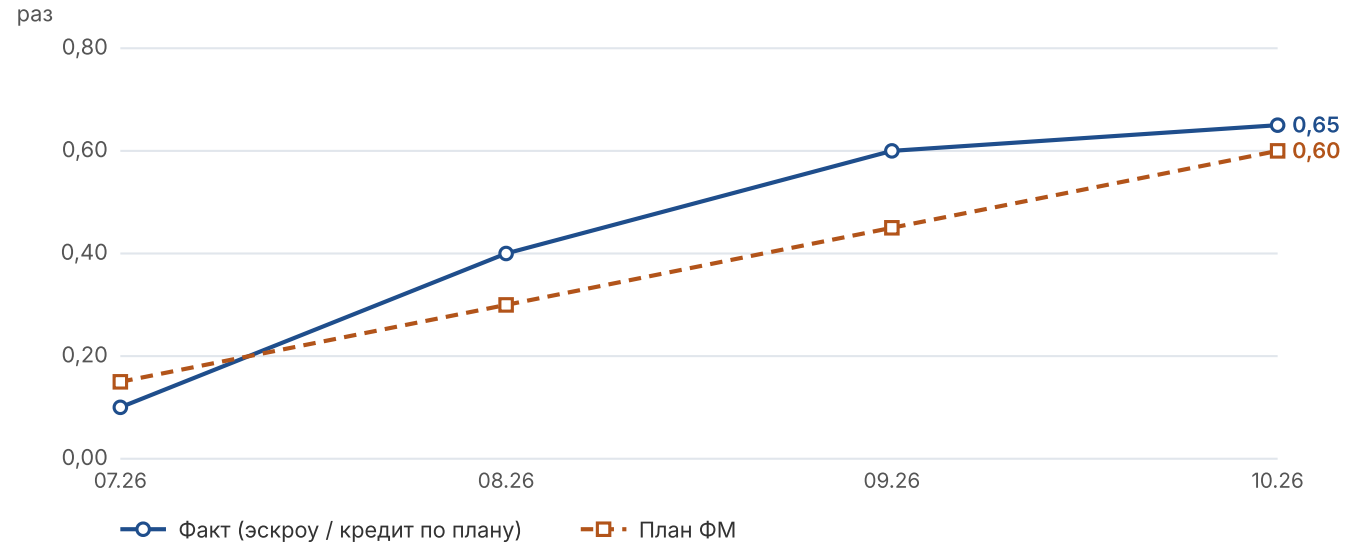

Бюджет месяца

октябрь 2026: план — план-факт БДДС, оплачено — реестр платежей РСС на 18.10.2026; прошло 58,1% месяца

Статья бюджета	Коды РСС	План месяца	Оплачено	Осталось	Выполнено
Стройка и проектирование		**400,0 млн ₽**	**150,0 млн ₽**	**250,0 млн ₽**	**37,5%**
Основные объекты строительства	2.2, 2.3, 2.5	нет в бюджете	150,0 млн ₽	—	—
Прочие статьи бюджета главы (не разнесены по карте)		400,0 млн ₽	0 ₽	400,0 млн ₽	0,0%
Коммерческие расходы		**25,0 млн ₽**	**7,0 млн ₽**	**18,0 млн ₽**	**28,0%**
Реклама и PR	3.1	нет в бюджете	7,0 млн ₽	—	—
Прочие статьи бюджета главы (не разнесены по карте)		25,0 млн ₽	0 ₽	25,0 млн ₽	0,0%
Итого стройка и коммерческие расходы		**425,0 млн ₽**	**157,0 млн ₽**	**268,0 млн ₽**	**36,9%**
Служба заказчика, охрана и офис		10,0 млн ₽	0 ₽	10,0 млн ₽	0,0%
Всего по бюджету месяца		**435,0 млн ₽**	**157,0 млн ₽**	**278,0 млн ₽**	**36,1%**

Красным — статьи с перерасходом, жёлтым — статья с самым большим неоплаченным остатком. Служба заказчика в итог стройки и коммерческих расходов не входит: в статье 2.6 РСС кроме службы заказчика и охраны лежат зарплаты офиса и связь, которые бюджет относит к административным расходам, — её процент с планом не сравним. «Всего по бюджету месяца» — строка «РАСХОДЫ» бюджета: стройка, коммерческие расходы, служба заказчика, земля (глава 1) и административно-хозяйственные расходы. Оплаты административно-хозяйственных расходов в РСС нет, поэтому в «Оплачено» их не видно.

Оплаты — из отчёта РСС от 18.10.2026.

Бюджет на октябрь 2026: план и оплачено по статьям




Служба заказчика, охрана и офис: в статье 2.6 РСС кроме службы заказчика и охраны оплачиваются зарплаты офиса и связь, которые бюджет относит к административно-хозяйственным расходам, поэтому оплачено здесь больше плана службы заказчика.

Прогноз освоения до конца месяца по нынешнему темпу

Строка	План месяца	Оплачено	Прогноз к концу месяца	Против плана
Стройка и проектирование	400,0 млн ₽	150,0 млн ₽	258,3 млн ₽	−141,7 млн ₽
Коммерческие расходы	25,0 млн ₽	7,0 млн ₽	12,1 млн ₽	−12,9 млн ₽

Стройка и проектирование: план и оплачено по месяцам

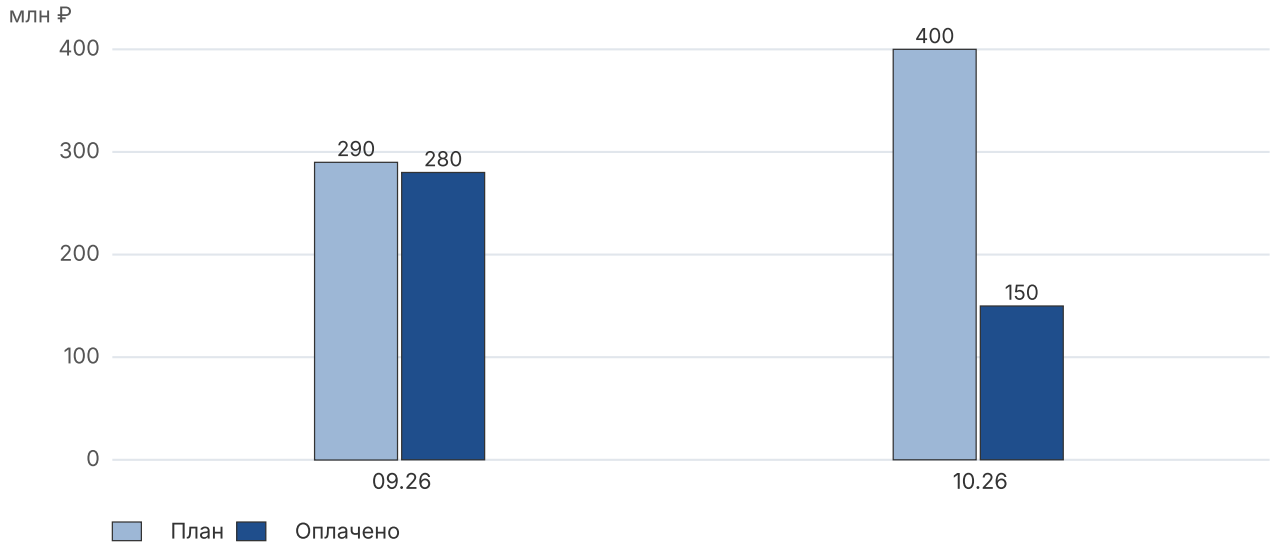

Месяц	Стройка: план	Стройка: оплачено	Коммерция: план	Коммерция: оплачено
сентябрь 2026	290,0 млн ₽	280,0 млн ₽	20,0 млн ₽	0 ₽
октябрь 2026	400,0 млн ₽	150,0 млн ₽	25,0 млн ₽	7,0 млн ₽

«Нет данных» — месяц раньше первой оплаты в реестре РСС; «нет плана» — месяца нет ни в одном загруженном бюджете.

Бюджет за сентябрь 2026 по главам

Глава бюджета	План	Факт	Отклонение
Глава 2 — стройка и проектирование, со службой заказчика	300,0 млн ₽	280,0 млн ₽	−20,0 млн ₽
Глава 3 — коммерческие расходы	20,0 млн ₽	21,0 млн ₽	+1,0 млн ₽

Отклонения по статьям бюджета за сентябрь 2026

Статья	План	Факт	Отклонение
Служба заказчика, охрана и офис	10,0 млн ₽	9,0 млн ₽	−1,0 млн ₽

Плюс — перерасход, минус — недоосвоение. Данные — из план-факта БДДС от 02.10.2026.

Оплачено с начала месяца по статьям РСС

Статья РСС	Оплачено
2.2.1.4 Монолит	150,0 млн ₽
3.1 статья без названия в РСС	7,0 млн ₽

Крупнейшие получатели оплат с начала месяца

Контрагент	Оплачено
СтройКо	157,0 млн ₽

Споры и претензии

Споры в реестр пока не внесены, поэтому в сводке их нет. Загрузите документы спора на странице сводки, проверьте карточку, которую предложит Платон, и подтвердите её.

Общая информация

Арбитраж с подрядчиком (новое): Иск подан — 14.10.2026, Иванов
