Сводка по проекту «Гродненская»

за неделю 12.10 — 18.10.2026

СТРОЙКА: ВЫПОЛНЕНО
0,0%
план 58,0%, −58,0 п. п.

РАБОЧИХ В СРЕДНЕМ В ДЕНЬ
нет данных
отчётов со стройки за период нет

ПРОДАЖИ КВАРТАЛА К ПЛАНУ ФИНМОДЕЛИ
нет данных
отчёт о продажах не подключён

ПРОДАЖИ КВАРТАЛА К ПЛАНУ БАНКА
нет данных
отчёт о продажах не подключён

УТВЕРЖДЁННЫЙ БЮДЖЕТ
6,64 млрд ₽
главы 1–3, финмодель

ЛИМИТ БАНКА
4,64 млрд ₽
смета РСС, главы 1–3

ВЫБРАНО У БАНКА
0 ₽
кредитом, главы 1–3; за неделю — 0 ₽

ОСТАТОК ЛИМИТА БАНКА
1,00 млрд ₽
лимит минус всё оплаченное 4,12 млрд ₽ (кредитом 0 ₽, своими деньгами 4,12 млрд ₽); резерв 306,1 млн ₽; по РСС не хватает 1,06 млрд ₽ с ноября 2026

ДЕФИЦИТ НА ДОСТРОЙКУ
1,21 млрд ₽
утверждённый бюджет минус оплаченное (2,52 млрд ₽) против остатка лимитов и резерва (1,31 млрд ₽)

ЭСКРОУ ПОКРЫВАЕТ КРЕДИТ
нет данных
нет плана кредита или эскроу

БЮДЖЕТ СТРОЙКИ ЗА МЕСЯЦ
33,6%
оплачено 74,0 млн ₽ из 220,0 млн ₽; прошло 58,1% месяца; перерасход по 1 статье

БЮДЖЕТ КОММЕРЦИИ ЗА МЕСЯЦ
50,0%
оплачено 6,0 млн ₽ из 12,0 млн ₽; прошло 58,1% месяца

Главное за период

- **Стройка.** Выполнено 0,0% работ по графику при плане 58,0% — отставание 58,0 п. п. Источник: утверждённый ГПР от 01.07.2026.
- ***Люди на площадке.*** *Ежедневные отчёты со стройки не приходили: чат стройки не связан с ботом или отчётов ещё не было.*
- **Отстающие работы.** Больше всего отстают: Монолит (Корпус 1) — 60,6 п. п.; Фасад (Корпус 2) — 52,8 п. п. Источник: утверждённый ГПР от 01.07.2026.
- ***Срок.*** *Прогноз срока не посчитан: нет утверждённого срока и прогноза.*
- **Бюджет месяца.** По стройке и коммерческим расходам оплачено 80,0 млн ₽ из 232,0 млн ₽ (34,5%), осталось 152,0 млн ₽; стройка и проектирование — оплачено 74,0 млн ₽ из 220,0 млн ₽ (33,6%); коммерческие расходы — оплачено 6,0 млн ₽ из 12,0 млн ₽ (50,0%); приобретение проекта (земля) — оплачено 0 ₽ из 50,0 млн ₽ (0,0%); административно-хозяйственные расходы — оплачено — из 9,0 млн ₽ (—); перерасход: «Прочие работы и затраты (содержание стройплощадки)» на 3,0 млн ₽; больше всего не оплачено по статье «Основные объекты строительства» — 140,0 млн ₽ из 200,0 млн ₽; без плана в бюджете оплачено 4,0 млн ₽; по нынешнему темпу к концу месяца стройке оплатят около 127,4 млн ₽ — на 92,6 млн ₽ меньше плана. Прошло 58,1% месяца. Источник: план-факт БДДС от 01.10.2026, РСС от 18.10.2026.
- ***Продажи.*** *Проект не связан с отчётом о продажах: выберите его на странице «Сводка руководству».*
- **Финансирование.** По утверждённому бюджету 6,64 млрд ₽ не хватает на достройку 1,21 млрд ₽; по рсс не хватает 1,06 млрд ₽ с ноября 2026; выборка кредита за неделю — 0 ₽ (за предыдущий такой же период — 0 ₽). Источник: РСС от 18.10.2026, карточка финансирования Монитора, план «КРЕДИТЫ».
- ***Споры.*** *Споры в реестр пока не внесены, поэтому в сводке их нет. Загрузите документы спора на странице сводки, проверьте карточку, которую предложит Платон, и подтвердите её.* *Источник: реестр споров.*

Стройка

	План к дате	Выполнено	Отставание
Весь проект	58,0%	0,0%	−58,0 п. п.
Корпус 1	60,6%	0,0%	−60,6 п. п.
Корпус 2	52,8%	0,0%	−52,8 п. п.

Прирост за период посчитать не из чего: на начало периода не было графика с процентами выполнения.

Проценты — утверждённый ГПР от 01.07.2026: то же, что показывает Монитор на эту дату.

Недельный ГПР-факт с процентами в Монитор не загружали: выполнение взято из утверждённого ГПР и решений, принятых в Мониторе.

Больше всего отстают (с отставанием 2 работы)

Работа	Объект	План к дате	Выполнено	Отставание	Окончание по плану
Монолит	Корпус 1	60,6%	0,0%	−60,6 п. п.	28.12.2026
Фасад	Корпус 2	52,8%	0,0%	−52,8 п. п.	29.11.2026

Работы без прироста не выделены: на начало периода не было графика с процентами.

Люди на площадке

Ежедневные отчёты со стройки не приходили: чат стройки не связан с ботом или отчётов ещё не было.

Сроки работ по корпусам

В Мониторе нет утверждённого графика работ с датами — рисовать нечего.

Продажи

Проект не связан с отчётом о продажах: выберите его на странице «Сводка руководству».

Финансирование

Лимит банка (главы 1–3)	Сумма
Лимит по смете РСС	4,64 млрд ₽
Оплачено с начала проекта (кредитом и своими деньгами)	4,12 млрд ₽
в том числе кредитом	0 ₽
Перерасход по статьям (остаток не уменьшает)	410,0 млн ₽
Лимиты статей финкниги против сметы РСС	70,0 млн ₽
Остаток лимитов статей	1,00 млрд ₽
Резерв	306,1 млн ₽
Не хватает по РСС	1,06 млрд ₽ с ноября 2026

Утверждённый бюджет (главы 1–3, финмодель)	Сумма
Утверждённый бюджет	6,64 млрд ₽
Оплачено с начала проекта	4,12 млрд ₽
Остаток потребности (бюджет минус оплаченное)	2,52 млрд ₽
Лимиты статей и резерв по РСС	1,31 млрд ₽
Не хватает по утверждённому бюджету	1,21 млрд ₽

	За неделю	С начала месяца	С начала проекта
Выборка кредита (платежи из заёмных средств, главы 1–3)	0 ₽	0 ₽	0 ₽
Услуги банка, статья 3.5 (в том числе проценты)	0 ₽	7,0 млн ₽	7,0 млн ₽

Проект не связан с отчётом о продажах — плана банка нет.

Проект не связан с отчётом о продажах — эскроу и план кредита взять неоткуда.

Платежи — из отчёта РСС от 18.10.2026.

Бюджет месяца

октябрь 2026: план — план-факт БДДС, оплачено — реестр платежей РСС на 18.10.2026; прошло 58,1% месяца

Статья бюджета	Коды РСС	План месяца	Оплачено	Осталось	Выполнено
Стройка и проектирование		**220,0 млн ₽**	**74,0 млн ₽**	**146,0 млн ₽**	**33,6%**
Проектные и изыскательские работы, авторский надзор	2.7	10,0 млн ₽	2,0 млн ₽	8,0 млн ₽	20,0%
Основные объекты строительства	2.2, 2.3, 2.5	200,0 млн ₽	60,0 млн ₽	140,0 млн ₽	30,0%
Прочие работы и затраты (содержание стройплощадки)	2.2.1.10, 2.2.2.8	5,0 млн ₽	8,0 млн ₽	**−3,0 млн ₽**	160,0%
Наружные сети и сооружения	2.4	5,0 млн ₽	0 ₽	5,0 млн ₽	0,0%
Без плана: 2.8 Технологическое присоединение	2.8	без плана	4,0 млн ₽	—	—
Коммерческие расходы		**12,0 млн ₽**	**6,0 млн ₽**	**6,0 млн ₽**	**50,0%**
Реклама и PR	3.1	6,0 млн ₽	5,0 млн ₽	1,0 млн ₽	83,3%
Расходы на продажу	3.2, 3.4	3,0 млн ₽	0 ₽	3,0 млн ₽	0,0%
Персонал и офис отдела продаж	3.7	3,0 млн ₽	1,0 млн ₽	2,0 млн ₽	33,3%
Итого стройка и коммерческие расходы		**232,0 млн ₽**	**80,0 млн ₽**	**152,0 млн ₽**	**34,5%**
Служба заказчика, охрана и офис		13,0 млн ₽	20,0 млн ₽	**−7,0 млн ₽**	153,8%
Приобретение проекта (земля)	глава 1	50,0 млн ₽	0 ₽	50,0 млн ₽	0,0%
Административно-хозяйственные расходы	нет в РСС	9,0 млн ₽	нет в РСС	—	—
Всего по бюджету месяца		**304,0 млн ₽**	**100,0 млн ₽**	**204,0 млн ₽**	**32,9%**

Красным — статьи с перерасходом, жёлтым — статья с самым большим неоплаченным остатком. Служба заказчика в итог стройки и коммерческих расходов не входит: в статье 2.6 РСС кроме службы заказчика и охраны лежат зарплаты офиса и связь, которые бюджет относит к административным расходам, — её процент с планом не сравним. «Всего по бюджету месяца» — строка «РАСХОДЫ» бюджета: стройка, коммерческие расходы, служба заказчика, земля (глава 1) и административно-хозяйственные расходы. Оплаты административно-хозяйственных расходов в РСС нет, поэтому в «Оплачено» их не видно.

Оплаты — из отчёта РСС от 18.10.2026.

Бюджет на октябрь 2026: план и оплачено по статьям




Служба заказчика, охрана и офис: в статье 2.6 РСС кроме службы заказчика и охраны оплачиваются зарплаты офиса и связь, которые бюджет относит к административно-хозяйственным расходам, поэтому оплачено здесь больше плана службы заказчика.

Прогноз освоения до конца месяца по нынешнему темпу

Строка	План месяца	Оплачено	Прогноз к концу месяца	Против плана
Стройка и проектирование	220,0 млн ₽	74,0 млн ₽	127,4 млн ₽	−92,6 млн ₽
Коммерческие расходы	12,0 млн ₽	6,0 млн ₽	10,3 млн ₽	−1,7 млн ₽

Стройка и проектирование: план и оплачено по месяцам

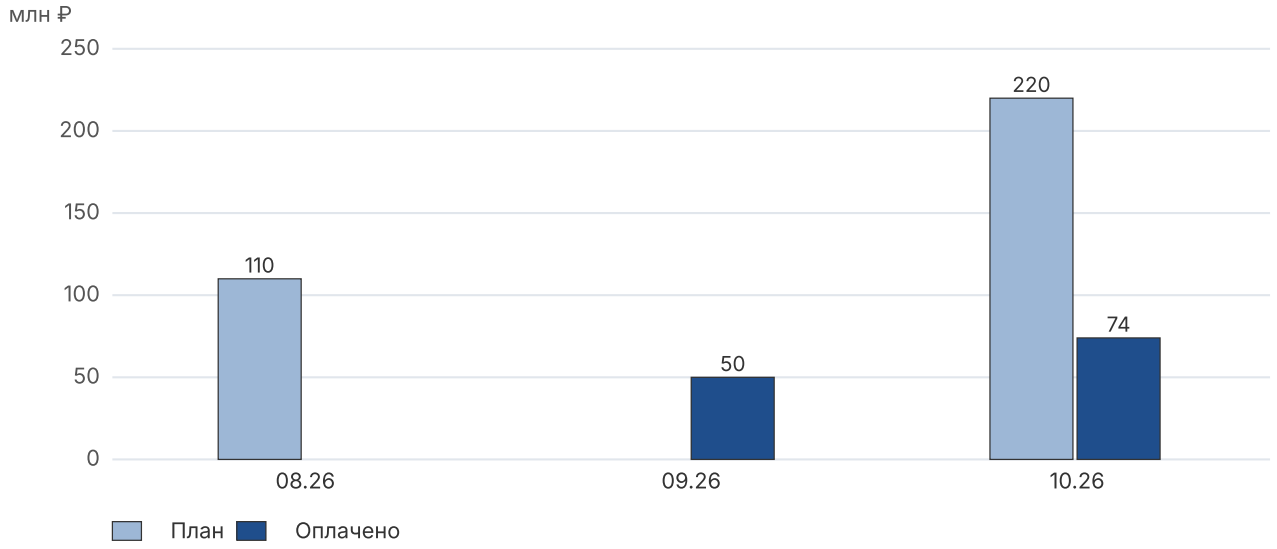

Месяц	Стройка: план	Стройка: оплачено	Коммерция: план	Коммерция: оплачено
август 2026	110,0 млн ₽	нет данных	6,0 млн ₽	нет данных
сентябрь 2026	нет плана	50,0 млн ₽	нет плана	0 ₽
октябрь 2026	220,0 млн ₽	74,0 млн ₽	12,0 млн ₽	6,0 млн ₽

«Нет данных» — месяц раньше первой оплаты в реестре РСС; «нет плана» — месяца нет ни в одном загруженном бюджете.

Отклонения по статьям бюджета: в бюджете от 2026-10-01 нет месяца 09.2026.

Оплачено с начала месяца по статьям РСС

Статья РСС	Оплачено
2.2.1.4 Монолит	60,0 млн ₽
2.6 Содержание службы заказчика	20,0 млн ₽
2.2.1.10 Содержание стройплощадки	8,0 млн ₽
3.1 Реклама	5,0 млн ₽
2.8 Технологическое присоединение	4,0 млн ₽
2.7 Проектные работы	2,0 млн ₽
3.7 Прочие	1,0 млн ₽

Крупнейшие получатели оплат с начала месяца

Контрагент	Оплачено
СтройКо	100,0 млн ₽

Общая информация

Споры и претензии

Споры в реестр пока не внесены, поэтому в сводке их нет. Загрузите документы спора на странице сводки, проверьте карточку, которую предложит Платон, и подтвердите её.

Открытых вопросов нет, за период записей не было.
