# Сводка по проекту «Гродненская»

за неделю 12.10 — 18.10.2026

## Главное за период

**Стройка**

Выполнено 50,0% работ по графику при плане 58,0% — отставание 8,0 п. п. За неделю отставание сократилось на 14,8 п. п.

Источник: ГПР-факт от 16.10.2026

**Срок**

Прогноз ввода при нынешнем темпе — 15.01.2027; утверждённого срока ввода в данных Монитора нет, сравнить не с чем.

Источник: прогноз Монитора по темпу работ

**Бюджет месяца**

Стройка и проектирование — оплачено 200,0 млн ₽ из 400,0 млн ₽ (50,0%), осталось 200,0 млн ₽; коммерческие расходы — оплачено 7,0 млн ₽ из 25,0 млн ₽ (28,0%), осталось 18,0 млн ₽. Прошло 58,1% месяца.

Источник: план-факт БДДС от 02.10.2026, РСС от 18.10.2026

**Продажи**

С начала квартала продано 3 договора на 45,0 млн ₽, 180 м²; план финмодели выполнен на 37,5% (меньше на 75,0 млн ₽, 300 м²); план банка выполнен на 34,6% (меньше на 85,0 млн ₽, 340 м²). За неделю — 30,0 млн ₽, за предыдущий такой же период — 15,0 млн ₽.

Источник: контрактация от 20.10.2026, планы ФМ и банка

**Финансирование**

Выборка кредита за неделю — 48,0 млн ₽ (за предыдущий такой же период — 120,0 млн ₽); эскроу очереди «1 очередь» покроет кредит на 1,05× по плану и на 1,40× при нынешнем темпе.

Источник: РСС от 18.10.2026, карточка финансирования Монитора, план «КРЕДИТЫ»

**Открытые вопросы**

Открытых вопросов: 1, новых или изменённых за неделю: 1 — «Арбитраж с подрядчиком».


Источник: общая информация по проекту

## Стройка

| | План к дате | Выполнено | Отставание |
|---|---|---|---|
| Весь проект | 58,0% | 50,0% | −8,0 п. п. |
| Корпус 1 | 60,6% | 55,0% | −5,6 п. п. |
| Корпус 2 | 52,8% | 40,0% | −12,8 п. п. |

За неделю выполнение выросло на 20,0 п. п. Проценты — из графика работ от 16.10.2026.

**Выполнение по графику работ: план и факт на дату каждого ГПР-факта**

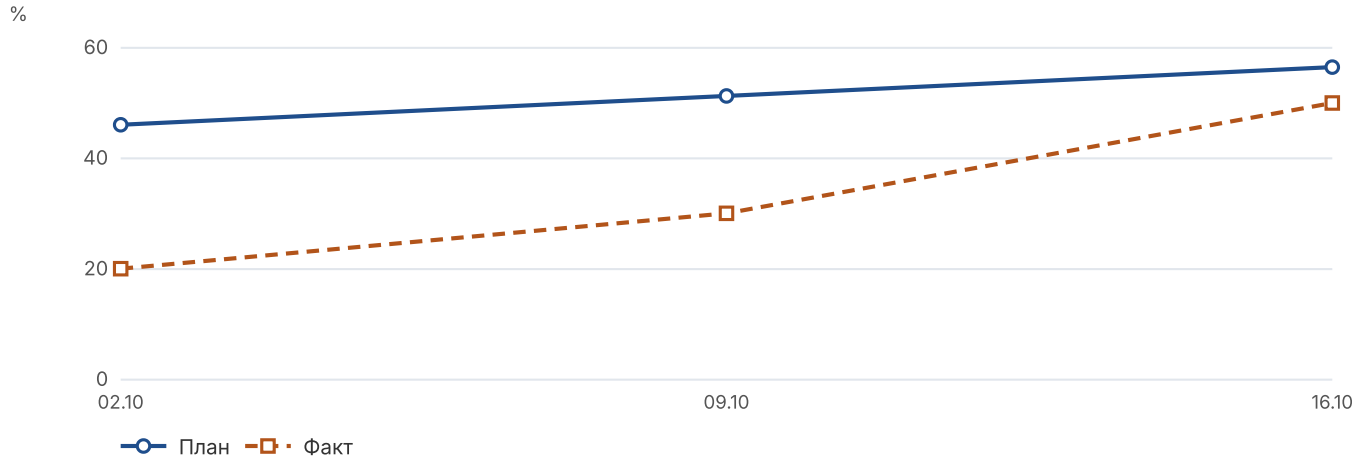



Ввод: утверждённого срока в данных нет, прогноз Монитора при нынешнем темпе 15.01.2027.

## Продажи

| Факт | Договоров | Сумма | Площадь | Цена квартир, ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| За неделю | 2 | 30,0 млн ₽ | 120 м² | 250 000 ₽ |
| С начала месяца (октябрь 2026) | 3 | 45,0 млн ₽ | 180 м² | 250 000 ₽ |
| С начала квартала (4 квартал 2026) | 3 | 45,0 млн ₽ | 180 м² | 250 000 ₽ |

| План | Сумма | Площадь |
|---|---|---|
| План финмодели на месяц | 40,0 млн ₽ | 160 м² |
| План финмодели на квартал | 120,0 млн ₽ | 480 м² |
| План банка на квартал | 130,0 млн ₽ | 520 м² |

**Продажи нарастающим итогом по кварталам, сумма договоров**

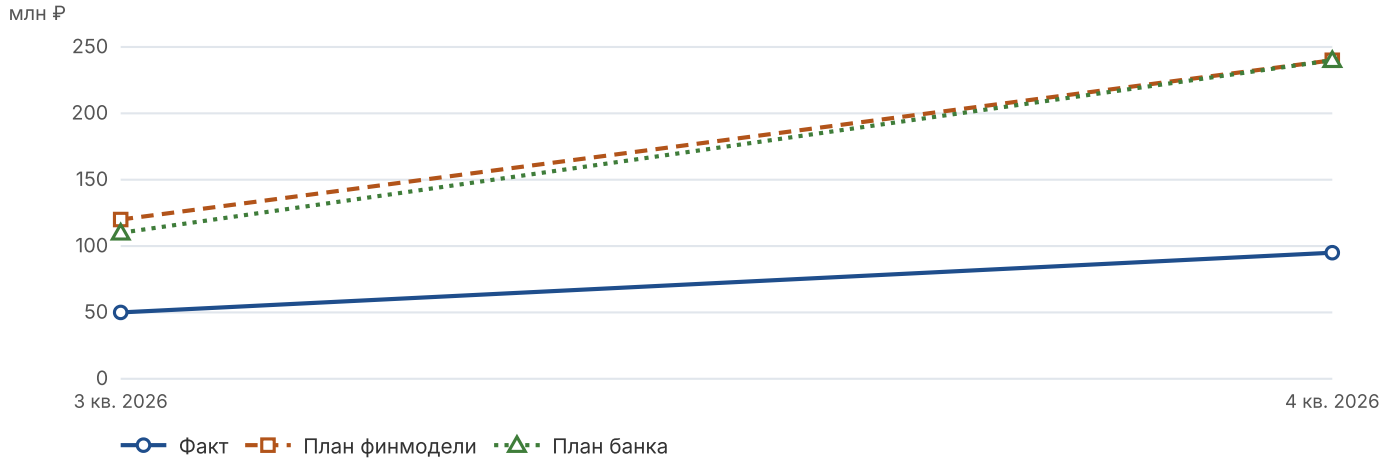

## Финансирование


*Лимит и дефицит не посчитаны: не загружен финансовый baseline.*

| | За неделю | С начала месяца | С начала проекта |
|---|---|---|---|
| Выборка кредита (платежи из заёмных средств) | 48,0 млн ₽ | 168,0 млн ₽ | 448,0 млн ₽ |
| Услуги банка, статья 3.5 (в том числе проценты) | 18,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |

| Эскроу, очередь | Месяц | Накоплено | План | Покрытие кредита по плану | При нынешнем темпе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 очередь | сентябрь 2026 | 60,0 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 1,05× | 1,40× |

Платежи — из отчёта РСС от 18.10.2026.

**Выборка кредита и эскроу нарастающим итогом по месяцам**

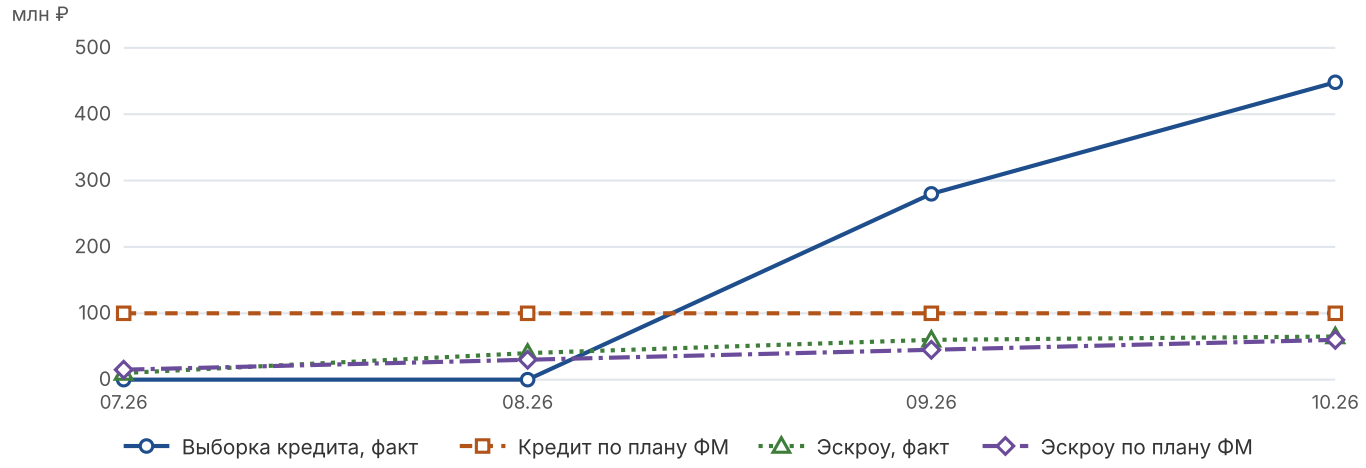


## Бюджет месяца

октябрь 2026

| Статья | План | Оплачено | Осталось |
|---|---|---|---|
| Стройка и проектирование | 400,0 млн ₽ | 200,0 млн ₽ | 200,0 млн ₽ |
| Коммерческие расходы | 25,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Служба заказчика, охрана и офис | — | 0 ₽ | — |

Оплаты — из отчёта РСС от 18.10.2026.

**Бюджет на октябрь 2026: план и оплачено по статьям**




## Общая информация

**Арбитраж с подрядчиком** (новое): Иск подан, заседание 12.11 — 14.10.2026, Иван Иванов
