Сводка по проекту «Гродненская»

за неделю 12.10 — 18.10.2026

СТРОЙКА: ВЫПОЛНЕНО
50,0%
план 58,0%, −8,0 п. п.

РАБОЧИХ В СРЕДНЕМ В ДЕНЬ
54
в прошлый период 69

ПРОДАЖИ КВАРТАЛА К ПЛАНУ ФИНМОДЕЛИ
37,5%
45,0 млн ₽ из 120,0 млн ₽; прошло 19,6% квартала

ПРОДАЖИ КВАРТАЛА К ПЛАНУ БАНКА
34,6%
45,0 млн ₽ из 130,0 млн ₽; прошло 19,6% квартала

ОСТАТОК ЛИМИТА БАНКА
нет данных
лимит не посчитан

ЭСКРОУ ПОКРЫВАЕТ КРЕДИТ
1,05×
по плану; при нынешнем темпе 1,40×

БЮДЖЕТ СТРОЙКИ ЗА МЕСЯЦ
33,6%
оплачено 74,0 млн ₽ из 220,0 млн ₽; прошло 58,1% месяца; перерасход по 1 статье

БЮДЖЕТ КОММЕРЦИИ ЗА МЕСЯЦ
50,0%
оплачено 6,0 млн ₽ из 12,0 млн ₽; прошло 58,1% месяца

Главное за период


- **Стройка.** Выполнено 50,0% работ по графику при плане 58,0% — отставание 8,0 п. п. За неделю отставание сократилось на 14,8 п. п. Источник: ГПР-факт от 16.10.2026.
- **Люди на площадке.** В среднем 54 рабочих и 16 ИТР в день, максимум 62 — по 4 отчётам из 7 дней периода; в предыдущий такой же период — 69 (−21%). Источник: ежедневные отчёты со стройки (бот).
- **Отстающие работы.** Больше всего отстают: Фасад (Корпус 2) — 12,8 п. п.; Монолит (Корпус 1) — 5,6 п. п. Источник: ГПР-факт от 16.10.2026.
- **Срок.** Прогноз ввода при нынешнем темпе — 15.01.2027; утверждённого срока ввода в данных Монитора нет, сравнить не с чем. Источник: прогноз Монитора по темпу работ.
- **Бюджет месяца.** По стройке и коммерческим расходам оплачено 80,0 млн ₽ из 232,0 млн ₽ (34,5%), осталось 152,0 млн ₽; стройка и проектирование — оплачено 74,0 млн ₽ из 220,0 млн ₽ (33,6%); коммерческие расходы — оплачено 6,0 млн ₽ из 12,0 млн ₽ (50,0%); перерасход: «Прочие работы и затраты (содержание стройплощадки)» на 3,0 млн ₽; больше всего не оплачено по статье «Основные объекты строительства» — 140,0 млн ₽ из 200,0 млн ₽; без плана в бюджете оплачено 4,0 млн ₽; по нынешнему темпу к концу месяца стройке оплатят около 127,4 млн ₽ — на 92,6 млн ₽ меньше плана. Прошло 58,1% месяца. Источник: план-факт БДДС от 02.10.2026, РСС от 18.10.2026.
- **Продажи.** С начала квартала продано 3 договора на 45,0 млн ₽, 180 м²; план финмодели выполнен на 37,5% (меньше на 75,0 млн ₽, 300 м²); план банка выполнен на 34,6% (меньше на 85,0 млн ₽, 340 м²). За неделю — 30,0 млн ₽, за предыдущий такой же период — 15,0 млн ₽. Продано 39,6% площади, осталось 580 м². Источник: контрактация от 20.10.2026, планы ФМ и банка.
- **Финансирование.** Выборка кредита за неделю — 0 ₽ (за предыдущий такой же период — 41,0 млн ₽); эскроу очереди «1 очередь» покроет кредит на 1,05× по плану и на 1,40× при нынешнем темпе; на эскроу за октябрь 2026 поступило 5,0 млн ₽. Источник: РСС от 18.10.2026, карточка финансирования Монитора, план «КРЕДИТЫ».
- **Открытые вопросы.** Открытых вопросов: 1, новых или изменённых за неделю: 1 — «Арбитраж с подрядчиком». Источник: общая информация по проекту.

Стройка

	План к дате	Выполнено	Отставание
Весь проект	58,0%	50,0%	−8,0 п. п.
Корпус 1	60,6%	55,0%	−5,6 п. п.
Корпус 2	52,8%	40,0%	−12,8 п. п.

За неделю выполнение выросло на 20,0 п. п. Проценты — из графика работ от 16.10.2026.

Выполнение по графику работ: план и факт на дату каждого ГПР-факта

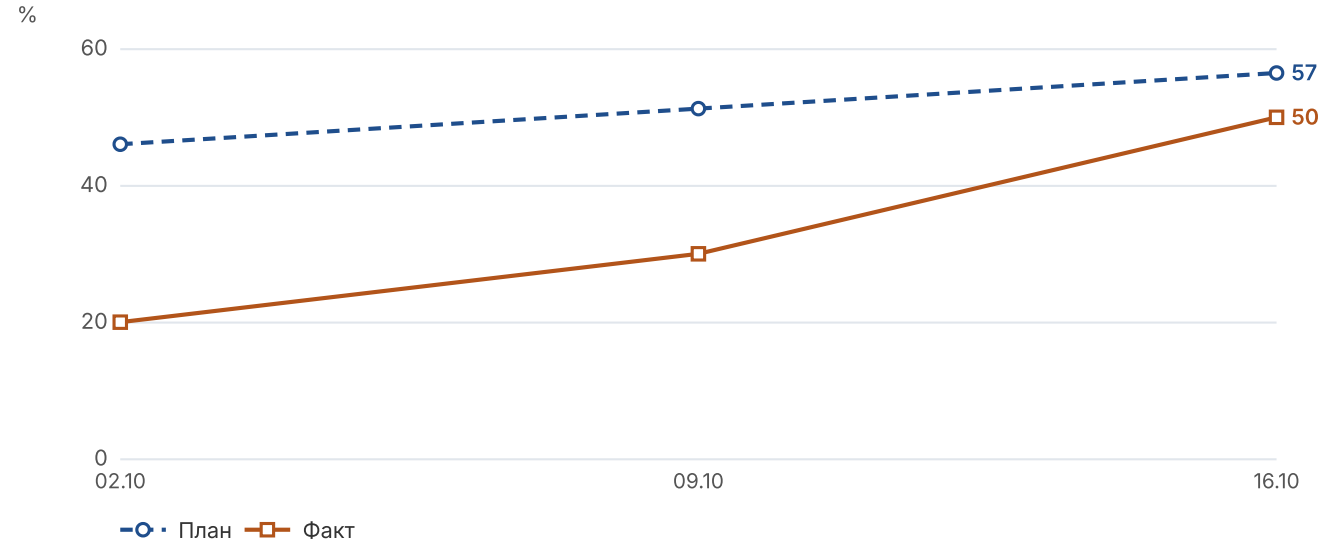

Больше всего отстают (с отставанием 2 работы)


Работа	Объект	План к дате	Выполнено	Отставание	Окончание по плану
Фасад	Корпус 2	52,8%	40,0%	−12,8 п. п.	29.11.2026
Монолит	Корпус 1	60,6%	55,0%	−5,6 п. п.	28.12.2026

Люди на площадке

	За неделю	Предыдущий такой же период
Дней с отчётом	4 из 7	3
Рабочих в среднем в день	54	69
Рабочих максимум	62	72
ИТР в среднем в день	16	16

Подрядчик	Рабочих в среднем	ИТР в среднем	Дней в отчётах
НУР	36	11	4
Клодо (кладка)	12	2	4
СПМ	6	3	4

Рабочих на площадке по дням (пропуск — дня без отчёта)

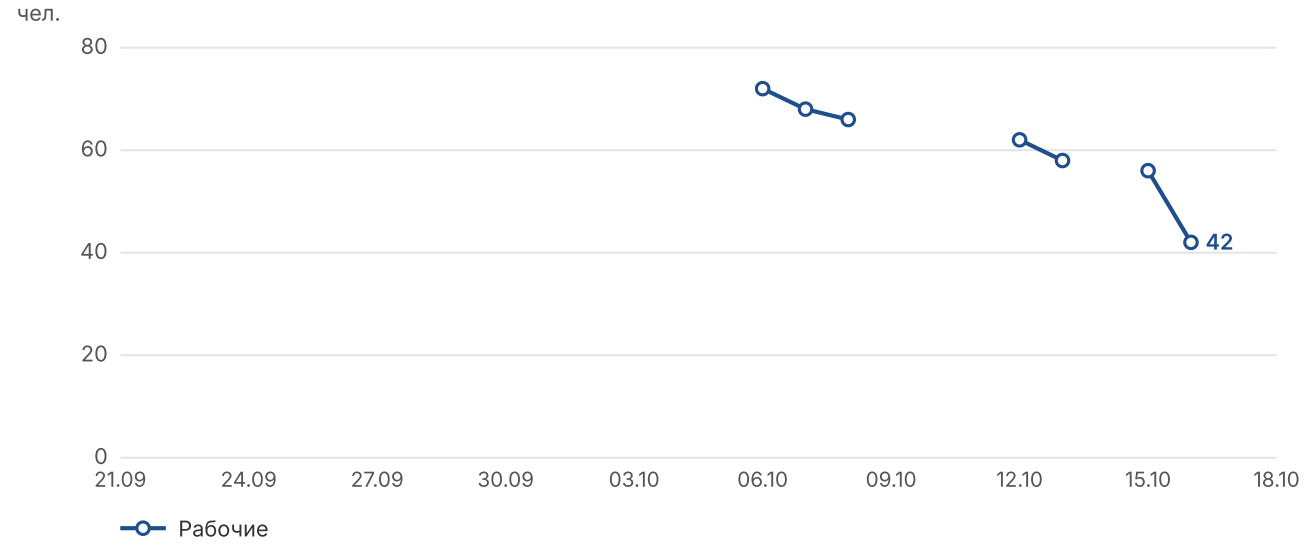

Плановой численности в графике работ нет — сравнение с планом не приводится.

Выполненные работы за неделю — по ежедневным отчётам со стройки

Подрядчик	Работы	Дни в отчётах
НУР	Корпус 1 монолит	12.10, 13.10, 15.10, 16.10
СПМ	Корпус 2 кладка перегородок 3 эт	13.10, 15.10, 16.10
Клодо (кладка)	Корпус 1 монтаж лесов	13.10, 15.10, 16.10

Строки — как их написали в отчёте; одинаковая строка за несколько дней показана один раз с датами.


Ввод: утверждённого срока в данных нет, прогноз Монитора при нынешнем темпе 15.01.2027.

Продажи

Факт	Договоров	Сумма	Площадь	Цена квартир, ₽/м²
За неделю	2	30,0 млн ₽	120 м²	250 000 ₽
С начала месяца (октябрь 2026)	3	45,0 млн ₽	180 м²	250 000 ₽
С начала квартала (4 квартал 2026)	3	45,0 млн ₽	180 м²	250 000 ₽

План	Сумма	Площадь
План финмодели на месяц	40,0 млн ₽	160 м²
План финмодели на квартал	120,0 млн ₽	480 м²
План банка на квартал	130,0 млн ₽	520 м²


Продажи нарастающим итогом по кварталам, сумма договоров

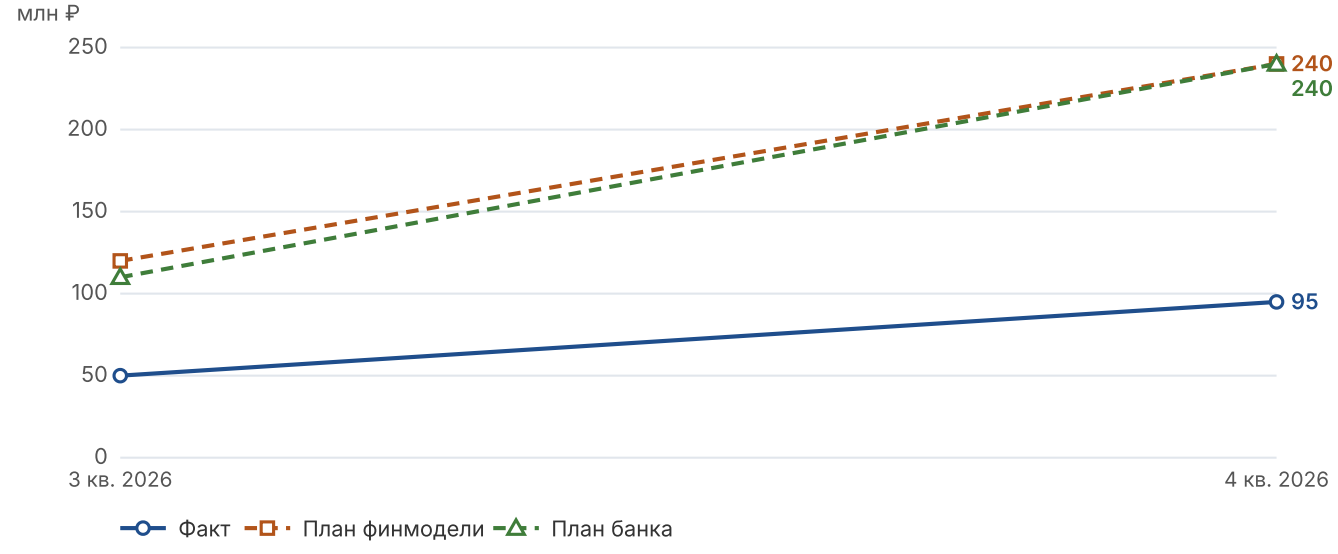


По типам помещений

Тип	За неделю: лотов	м²	сумма	С начала продаж: лотов	м²	сумма	Средняя цена	План ФМ на квартал
Квартира	2	120 м²	30,0 млн ₽	5	380 м²	95,0 млн ₽	250 000 ₽ за м²	0 ₽

Темп продаж: м² договоров по месяцам

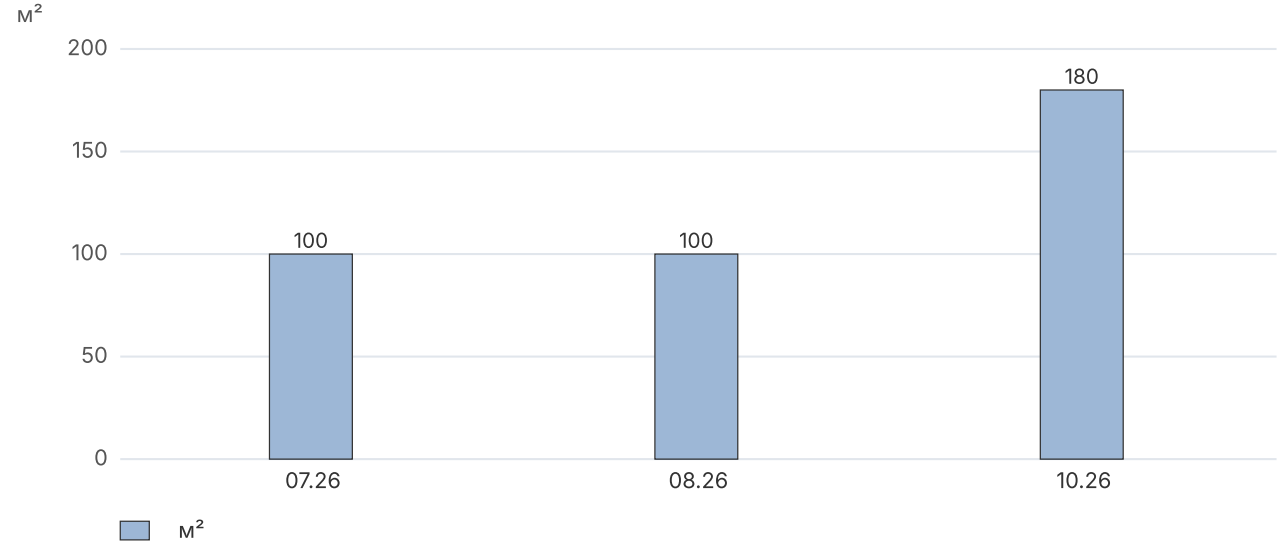

Средняя цена квартир по месяцам

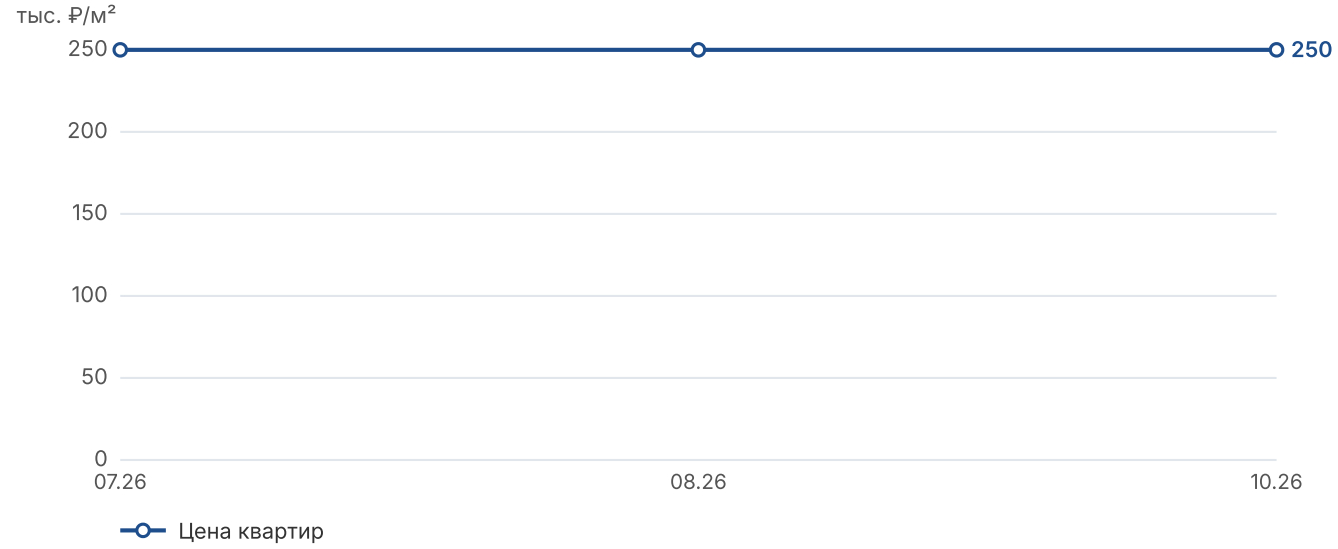

Формы оплаты (с начала продаж)

Форма оплаты	Договоров	Сумма	Доля
дефект заполнения CRM	5	95,0 млн ₽	100,0%

Остаток нераспроданного

Тип	Продано лотов	Всего лотов	Продано м²	Всего м²	Осталось м²
Квартира	5	—	380 м²	960 м²	580 м²

Финансирование


Лимит и дефицит не посчитаны: не загружен финансовый baseline.

	За неделю	С начала месяца	С начала проекта
Выборка кредита (платежи из заёмных средств)	0 ₽	101,0 млн ₽	151,0 млн ₽
Услуги банка, статья 3.5 (в том числе проценты)	0 ₽	7,0 млн ₽	7,0 млн ₽

Эскроу, очередь	Месяц	Накоплено	План	Покрытие кредита по плану	При нынешнем темпе
1 очередь	сентябрь 2026	60,0 млн ₽	45,0 млн ₽	1,05×	1,40×


Платежи — из отчёта РСС от 18.10.2026.

Выборка кредита и эскроу нарастающим итогом по месяцам

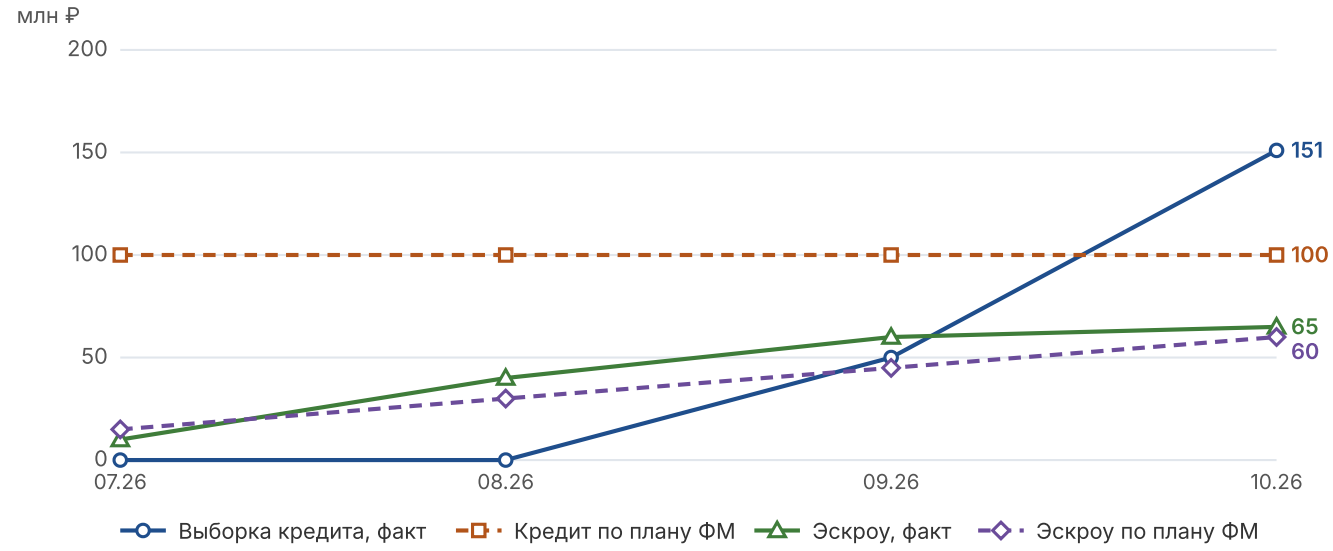

Поступления на эскроу по графикам договоров: за октябрь 2026 — 5,0 млн ₽, всего — 65,0 млн ₽. Поступления видны помесячно, поэтому за неделю их не выделить.

Покрытие кредита эскроу: факт и план по месяцам

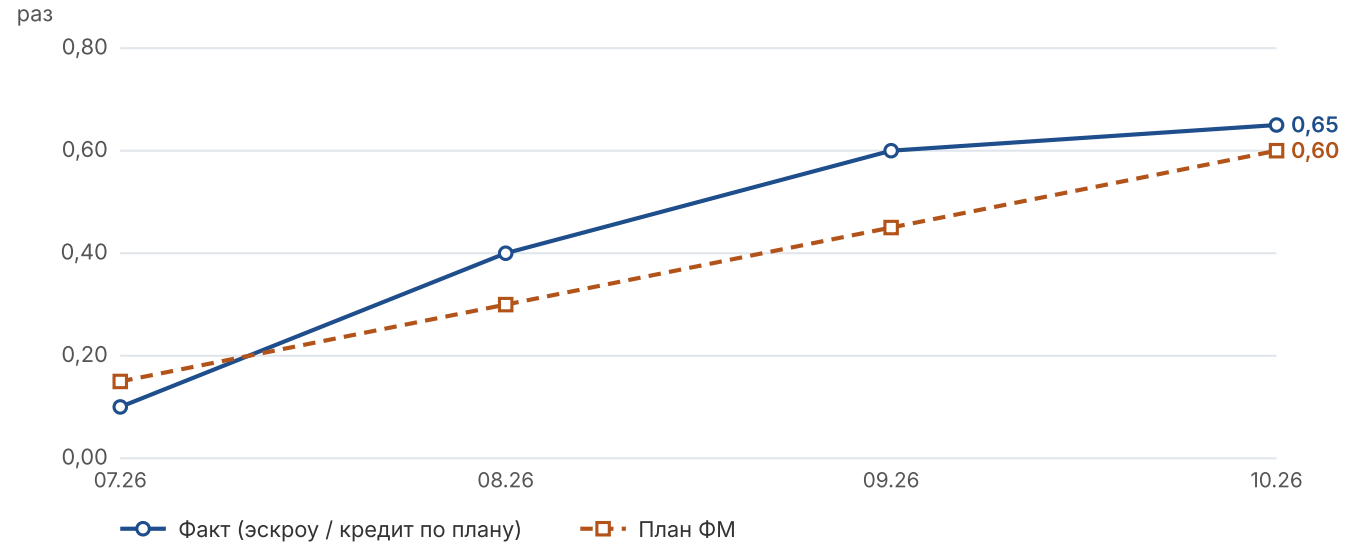

Бюджет месяца


октябрь 2026: план — план-факт БДДС, оплачено — реестр платежей РСС на 18.10.2026; прошло 58,1% месяца

Статья бюджета	Коды РСС	План месяца	Оплачено	Осталось	Выполнено
Стройка и проектирование		**220,0 млн ₽**	**74,0 млн ₽**	**146,0 млн ₽**	**33,6%**
Проектные и изыскательские работы, авторский надзор	2.7	10,0 млн ₽	2,0 млн ₽	8,0 млн ₽	20,0%
Основные объекты строительства	2.2, 2.3, 2.5	200,0 млн ₽	60,0 млн ₽	140,0 млн ₽	30,0%
Прочие работы и затраты (содержание стройплощадки)	2.2.1.10, 2.2.2.8	5,0 млн ₽	8,0 млн ₽	**−3,0 млн ₽**	160,0%
Наружные сети и сооружения	2.4	5,0 млн ₽	0 ₽	5,0 млн ₽	0,0%
Без плана: 2.8 Технологическое присоединение	2.8	без плана	4,0 млн ₽	—	—
Коммерческие расходы		**12,0 млн ₽**	**6,0 млн ₽**	**6,0 млн ₽**	**50,0%**
Реклама и PR	3.1	6,0 млн ₽	5,0 млн ₽	1,0 млн ₽	83,3%
Расходы на продажу	3.2, 3.4	3,0 млн ₽	0 ₽	3,0 млн ₽	0,0%
Персонал и офис отдела продаж	3.7	3,0 млн ₽	1,0 млн ₽	2,0 млн ₽	33,3%
Служба заказчика, охрана и офис	2.6	13,0 млн ₽	20,0 млн ₽	**−7,0 млн ₽**	153,8%
Итого стройка и коммерческие расходы		**232,0 млн ₽**	**80,0 млн ₽**	**152,0 млн ₽**	**34,5%**

Красным — статьи с перерасходом, жёлтым — статья с самым большим неоплаченным остатком. Служба заказчика в итог не входит: в статье 2.6 РСС кроме службы заказчика и охраны лежат зарплаты офиса и связь, которые бюджет относит к административным расходам, — её процент с планом не сравним.

Оплаты — из отчёта РСС от 18.10.2026.


Бюджет на октябрь 2026: план и оплачено по статьям

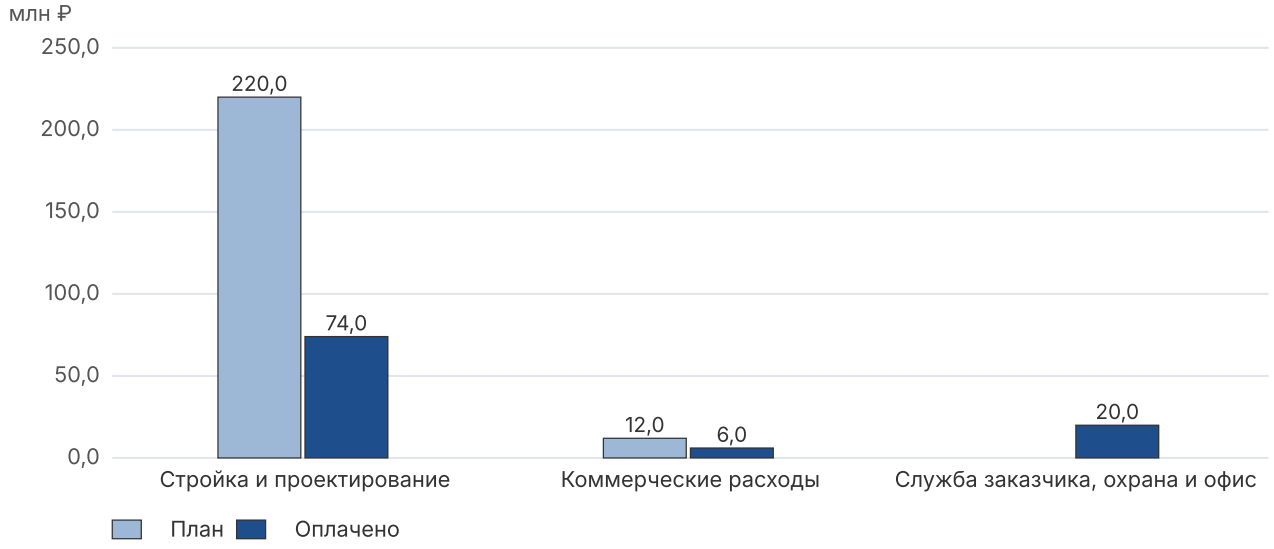

Прогноз освоения до конца месяца по нынешнему темпу

Строка	План месяца	Оплачено	Прогноз к концу месяца	Против плана
Стройка и проектирование	220,0 млн ₽	74,0 млн ₽	127,4 млн ₽	−92,6 млн ₽
Коммерческие расходы	12,0 млн ₽	6,0 млн ₽	10,3 млн ₽	−1,7 млн ₽

Стройка и проектирование: план и оплачено по месяцам

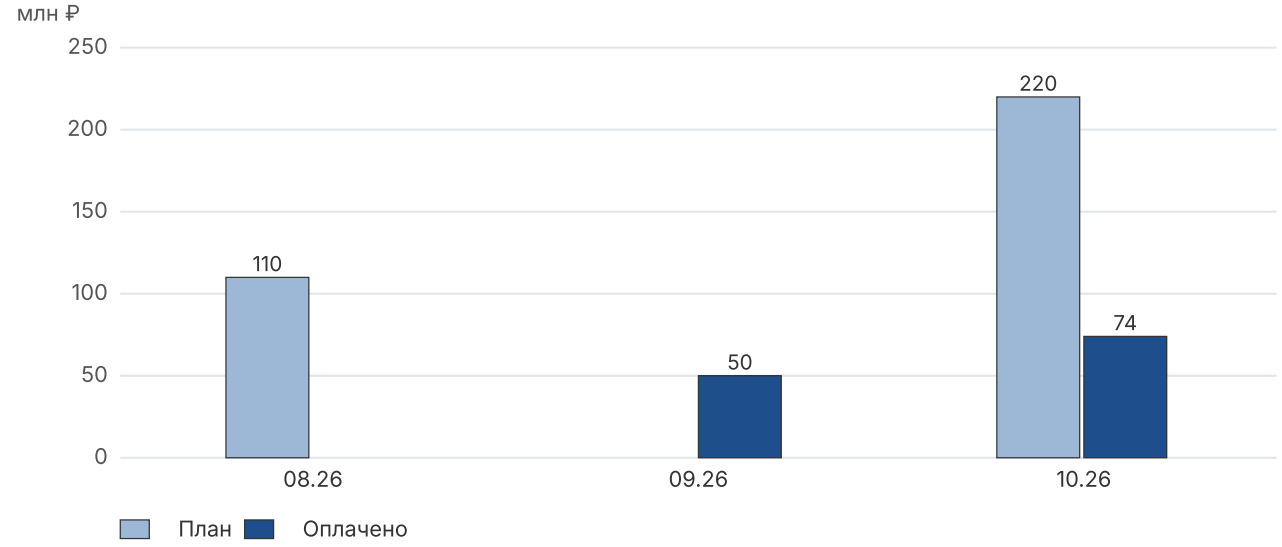

Месяц	Стройка: план	Стройка: оплачено	Коммерция: план	Коммерция: оплачено
август 2026	110,0 млн ₽	нет данных	6,0 млн ₽	нет данных
сентябрь 2026	нет плана	50,0 млн ₽	нет плана	0 ₽
октябрь 2026	220,0 млн ₽	74,0 млн ₽	12,0 млн ₽	6,0 млн ₽

«Нет данных» — месяц раньше первой оплаты в реестре РСС; «нет плана» — месяца нет ни в одном загруженном бюджете.

Отклонения по статьям бюджета за август 2026

Статья	План	Факт	Отклонение
Основные объекты строительства	100,0 млн ₽	95,0 млн ₽	−5,0 млн ₽
Прочие работы и затраты (содержание стройплощадки)	5,0 млн ₽	не платили	−5,0 млн ₽
Реклама и PR	4,0 млн ₽	2,0 млн ₽	−2,0 млн ₽
Проектные и изыскательские работы, авторский надзор	5,0 млн ₽	5,0 млн ₽	+0 ₽
Персонал и офис отдела продаж	2,0 млн ₽	2,0 млн ₽	+0 ₽

Плюс — перерасход, минус — недоосвоение. Данные — из план-факта БДДС от 02.10.2026.

Оплачено с начала месяца по статьям РСС

Статья РСС	Оплачено
2.2.1.4 Монолит	60,0 млн ₽
2.6 Содержание службы заказчика	20,0 млн ₽
2.2.1.10 Содержание стройплощадки	8,0 млн ₽
3.1 Реклама	5,0 млн ₽
2.8 Технологическое присоединение	4,0 млн ₽
2.7 Проектные работы	2,0 млн ₽
3.7 Прочие	1,0 млн ₽

Крупнейшие получатели оплат с начала месяца

Контрагент	Оплачено
СтройКо	100,0 млн ₽

Общая информация

Арбитраж с подрядчиком (новое): Иск подан, заседание 12.11 — 14.10.2026, Иван Иванов
